



Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Έργων LIFE για την ενίσχυση της απόδοσης των Σχεδίων Μετά LIFE

4η Έκθεση αναφοράς προόδου για τη Δράση Α.12 – Ιούλιος 2021

Greek LIFE Task Force

Περιεχόμενα

Συνοπτική Περιγραφή.....	4
Executive Summary.....	5
1 Εισαγωγή.....	6
2 Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων ανά Υπο-Πρόγραμμα, Τομέα Προτεραιότητας LIFE, Κατηγορία Έργων & Θεματικές Προτεραιότητες.....	9
3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΦΥΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ «ΦΥΣΗ (NAT)» και «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – (BIO)».....	10
4 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»	28
5 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – (GOVERNANCE)»	29
6 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – (INFORMATION)» ..	46
7 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»	60
8 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»	61
9 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ»	78
10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΝΕΡΟ».....	80
11 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ»	94
12 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ »	110
13 Επίλογος.....	127

Συνοπτική Περιγραφή

Η δράση A12 «Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Έργων LIFE για την ενίσχυση της απόδοσης των Σχεδίων Μετά LIFE (After LIFE Plans)», έχει ως βασικό σκοπό την συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης, την αξιολόγηση της επιτυχίας, αλλά και καταγραφή δυσκολιών κατά την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στα «Σχέδια Μετά LIFE (After LIFE Plans)». Η δράση A12 εστιάζει σε έργα LIFE τα οποία υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια, των οποίων η λήξη τοποθετείται χρονικά από το 2000 έως και το 2015, και συνεπώς σε αυτή την χρονική περίοδο τοποθετείται ημερομηνιακά και η έναρξη των αντίστοιχων για κάθε έργο «Σχεδίων Μετά LIFE» (After LIFE Plans).

Η στρατηγική για την δημιουργία δείγματος προς ανάλυση στα πλαίσια της δράσης A12, οδήγησε στην συγκέντρωση συνολικά 54 «Σχεδίων Μετά LIFE» (After LIFE Plans), βάσει 3 παραμέτρων: (i) έργα LIFE για τα οποία δικαιούχος συντονιστής (Coordinating beneficiary) είναι ελληνικός φορέας και τα οποία υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια, (ii) έργα LIFE των οποίων η λήξη, και αντίστοιχα η χρονική έναρξη των «After LIFE Plans» τοποθετείται από το 2000 και έπειτα, (iii) έργα για τα οποία διατίθεται το ψηφιακό τους αρχείο στην Greek LIFE Task Force από την NEEMO ή από ενεργές διαδικτυακές σελίδες των έργων.

Η πρώτη παράμετρος επιλέχτηκε για να δημιουργηθεί μία γνωσιακή βάση δεδομένων, με τις δυνατότητες και αδυναμίες υλοποίησης των «Σχεδίων Μετά LIFE» στην ελληνική επικράτεια. Η δεύτερη παράμετρος επιλέχτηκε ώστε να αναλυθούν πρόσφατα υλοποιηθέντα «Σχέδια Μετά LIFE», και να οδηγήσουν σε προτάσεις διαχείρισης/υλοποίησης «Σχεδίων Μετά LIFE» οι οποίες να εξασφαλίσουν υψηλότερο δείκτη επιτυχίας και αντίκτυπου, για την καλύτερη αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, με το βλέμμα στον 21^ο αιώνα. Η τρίτη παράμετρος σχετίζεται με τη δυνατότητα παροχής συνόλου παραδοτέων και υλικού των έργων LIFE, προς καλύτερη πρόσβαση, αναζήτηση δεδομένων και γρήγορη ανάλυση.

Το 1^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου της δράσης A12 έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2017. Το 2^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου της δράσης A12, το παρόν, ολοκληρώθηκε και κατατίθεται/αναρτάται τον Απρίλιο του 2020. Το 3^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου, ολοκληρώθηκε τον Μάιο, και το 4^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου, το παρόν, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Executive Summary

The action A12 "Monitoring of After LIFE Projects to enhance the efficiency of After-LIFE Plans", has as its main purpose the collection, recording and analysis of data on the degree of completion, the evaluation of success, but also recording difficulties in implementing actions that included in the "After LIFE Plans". The A12 action focuses on LIFE projects that have been implemented in the Greek territory, the expiration of which is placed from 2000 to 2015, and therefore during this period is placed the date and/or the start of each respective "After LIFE Plans".

The strategy for creating a sample for analysis in the context of A12 action, led to the gathering of a total of 54 "After LIFE Plans", based on 3 parameters: (i) LIFE projects for which Coordinating beneficiary is Greek body and which were implemented in the Greek territory, (ii) LIFE projects whose expiration, and respectively the time start of "After LIFE Plans" is placed from 2000 onwards, (iii) projects for which their digital file is available in Greek LIFE Task Force from NEEMO or from active web pages of the projects.

The first parameter was chosen to create a knowledge database, with the capabilities and weaknesses of the implementation of "Post-LIFE Plans" in the Greek territory. The second parameter was chosen to analyze recently implemented "Post-LIFE Plans", and to lead to management / implementation proposals "Post-LIFE Plans" to ensure a higher success and impact, to better address climate, environmental and environmental issues, with the look at the 21st century challenges. The third parameter is related to the ability to provide a thorough and digital set of deliverables and datasets of LIFE projects, for better access, data retrieval and fast analysis. The 1st Delivery - Progress Report of A12 action took place in December 2017. The 2nd Delivery - Progress Report of action A12, was completed and submitted/posted in April 2020. The 3rd Deliverable - Progress Report, was completed at May 2021. The 4th Delivery - Progress Report, the present one, was completed in July 2021.

1 Εισαγωγή

Η δράση A.12 αφορά την παρακολούθηση ολοκληρωμένων Έργων LIFE για την ενίσχυση της απόδοσης των «Σχεδίων Μετά LIFE» (*After-LIFE plans*) και αποτελεί μία από τις 13 δράσεις υλοποίησης (20 δράσεις συνολικά) του έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής ομάδας LIFE Task Force» (LIFE14 CAP/GR/000003). Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον (*Πράσινο Ταμείο*) και τη Δράση για το Κλίμα (*ΥΠΕΝ*), με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης A12 προγραμματίζεται η σύνταξη 4 Παραδοτέων - Αναφορών Προόδου. Κάθε αναφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη περίοδο καθώς και μια σύντομη περίληψη των ενεργειών που σχεδιάζονται ή αναμένονται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Το 1^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου της δράσης A12 έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2017, όπου παρουσίασε τους βασικούς άξονες του δείγματος 54 «Σχεδίων Μετά LIFE» (*φορείς υλοποίησης, πηγές χρηματοδότησης, δράσεις διατήρησης/υλοποίησης, δράσεις επικοινωνίας/διάχυσης*). Τα 54 αυτά «Σχέδια Μετά LIFE» συλλέχθηκαν βάσει 3 παραμέτρων: **(i)** έργα LIFE για τα οποία δικαιούχος συντονιστής (*Coordinating beneficiary*) είναι ελληνικός φορέας και τα οποία υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια, **(ii)** έργα LIFE των οποίων η λήξη, και αντίστοιχα η χρονική έναρξη των «*After LIFE Plans*» τοποθετείται από το 2000 και έπειτα, **(iii)** έργα για τα οποία διατίθεται το ψηφιακό τους αρχείο στην Greek LIFE Task Force από την NEEMO ή από ενεργές διαδικτυακές σελίδες των έργων.

Η πρώτη παράμετρος επιλέχτηκε για να δημιουργηθεί μία γνωσιακή βάση δεδομένων, με τις δυνατότητες και αδυναμίες υλοποίησης των «Σχεδίων Μετά LIFE» στοχεύοντας αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια. Βέβαια, ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που θα ακολουθήσει, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα. Η δεύτερη παράμετρος επιλέχτηκε ώστε να αναλυθούν πρόσφατα υλοποιηθέντα «Σχέδια Μετά LIFE», και να οδηγήσουν σε προτάσεις διαχείρισης/υλοποίησης «Σχεδίων Μετά LIFE» βάσει σημερινών δεδομένων. Οι προτάσεις αυτές δύναται να εξασφαλίσουν υψηλότερο δείκτη επιτυχίας και αντίκτυπου, για την καλύτερη αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, με το βλέμμα στον 21^ο αιώνα. Η τρίτη παράμετρος, τέλος, σχετίζεται με τη δυνατότητα παροχής ψηφιακών παραδοτέων και υλικού των έργων LIFE, προς καλύτερη πρόσβαση, βέλτιστη αναζήτηση δεδομένων και γρήγορη ανάλυση.

Το 2^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου της δράσης Α12, το παρόν, ανέλυσε **(i)** την αντιστοίχιση των Τομέων Προτεραιότητας και Τομέων Έργων του προγράμματος LIFE, με τα 54 «Σχέδια Μετά LIFE», με σκοπό την ομαδοποίηση και ανάπτυξη των ερωτηματολογίων, **(ii)** τη δομή των 11 διακριτών online ερωτηματολογίων (*Google Forms*) τα οποία θα απεστάλλησαν αντίστοιχα στους υπεύθυνους υλοποίησης των 54 «Σχεδίων Μετά LIFE», **(iii)** τον λόγο για τον οποίο δομήθηκαν με τον συγκεκριμένο τρόπο τα ερωτηματολόγια, **(iv)** τον προτεινόμενο τρόπο μαθηματικοποίησης, παραμετροποίησης, και ανάλυσης των δεδομένων (*datasets*) που θα προκύψουν από τις συλλεχθέντες απαντήσεις, **(v)** τον στόχο και τον τρόπο παρουσίασης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την ανάλυση των συλλεχθέντων απαντήσεων, και **(vi)** τα επόμενα βήματα.

Το 3^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου, απαρίθμησε το σύνολο των φορέων, οργανισμών, και υπεύθυνων προσώπων, και τον αριθμο επικοινωνιών που έλαβαν χώρα τόσο για την αποστολή των ερωτηματολογίων στα κατάλληλα πρόσωπα για συμπλήρωση, και για την διασαφήνιση όλων των σημείων που πρέπει να συμπληρωθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά, όσο και τον αριθμό των αποκρίσεων/απαντήσεων του κάθε φορέα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

Το 4^ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου, το παρόν, περιλαμβάνει την τελική διαμόρφωση του σετ δεδομένων από το σύνολο απαντήσεων στα *Google Forms* ερωτηματολόγια, την ανάλυση αυτών των δεδομένων, την παρουσίαση αποτελεσμάτων, την οπτικοποίηση και τα γραφήματα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, και διαχειριστικές προτάσεις βασισμένες στο σύνολο των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, σκοπός της δράσης Α.12 είναι η αποτύπωση επιτευγμάτων, δυνατών σημείων, αδυναμιών, προβλημάτων και γενικότερων τάσεων των υλοποιηθέντων «Σχεδίων Μετά LIFE», στην ελληνική επικράτεια από το 2000 και έπειτα. Στόχος της δράσης είναι στη συνέχεια η ανάλυση και η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, και η διάχυση τους, ώστε όλοι οι μελλοντικοί δικαιούχοι που θα υλοποιήσουν έργα LIFE αλλά και «Σχέδια Μετά LIFE», να έχουν ένα σαφές σημείο αναφοράς ώστε να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις δράσεις που έχουν στο έργο τους.

Σημειώνεται πως το Υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» δεν υπήρχε πριν το 2014 στις προσκλήσεις του LIFE. Συνεπώς μέχρι και σήμερα είναι λίγα τα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί σε αυτούς τους τομείς έργων στην ελληνική επικράτεια. Κατά συνέπεια, τα λίγα «Σχέδια Μετά LIFE» που επιλέχθηκαν για αποστολή ερωτηματολογίων και αξιολόγηση στο Υπο-Πρόγραμμα «Δράση

για το Κλίμα» (LIFE Climate Action), ανήκουν αφενός στην κατηγορία Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, αφετέρου έχουν κατεύθυνση «Κλίμα» όπως προβλεπόταν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 για τα έργα του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων». Για τον ίδιο λόγο, δεν εντοπίστηκε κανένα «Σχέδιο Μετά LIFE» το οποίο να ανήκει στον Τομέα Προτεραιότητας Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση (LIFE Climate Governance & Information), και αντίστοιχα δεν αναπτύχθηκαν ερωτηματολόγια για αυτόν τον Τομέα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθείται η αρχιτεκτονική του Προγράμματος LIFE όπως αυτή παρουσιάζεται στο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE 2018-2020, η οποία όμως δεν έχει ταύτιση ακριβώς με την περίοδο 2014-2018 όπως και ούτε με πιο πριν, και αντίστοιχα, από το 2021 και έπειτα αλλάζει ξανά συνολικά η αρχιτεκτονική του προγράμματος LIFE με την νέα προγραμματική περίοδο του 2021-2027. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης μπορούν να δώσουν σημαντική πληροφορία για την καλύτερη διαχείριση των After LIFE Plans από το σύνολο των δικαιούχων φορέων στην ελληνική επικράτεια, καθώς εστιάζουν σε δράσεις διαχείρισης, βαθμό επιτυχίας τους, και βαθμονόμηση παραμέτρων επιτυχίας και αποτυχίας.

2 Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων ανά Υπο-Πρόγραμμα, Τομέα Προτεραιότητας LIFE, Κατηγορία Έργων & Θεματικές Προτεραιότητες

Βάσει της διάκρισης Υπο-Προγραμμάτων LIFE του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, και του συνόλου των 54 «Σχεδίων Μετά LIFE» που συλλέχθηκαν, διακρίθηκαν 4 βασικοί Τομείς Προτεραιότητας για την παρουσίαση και την ανάλυση αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις στα 11 διακριτά ερωτηματολόγια των «Σχεδίων Μετά LIFE», όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 3^ο Παραδοτέο. Ειδικότερα:

Υπο-Πρόγραμμα «Περιβάλλον» - Τομείς Προτεραιότητας

- 1) Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (*LIFE Environment & Resource Efficiency*),
- 2) Φύση & Βιοποικιλότητα (*LIFE Nature & Biodiversity*)
- 3) Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση (*LIFE Environmental Governance & Information*),

Υπο-Πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» - Τομείς Προτεραιότητας

- 4) Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (*LIFE Climate Action*),

Εντός του κάθε Τομέα Προτεραιότητας κατηγοριοποιήθηκαν, διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν διακριτά/διαφορετικά ερωτηματολόγια αντίστοιχα με τις τις Κατηγορίες Έργων, τις Θεματικές Προτεραιότητες, τις Διαχειριστικές Δράσεις κατά περίπτωση αλλά και τις βαθμονομημένες Παραμέτρους Υλοποίησης, όπως παρατίθενται αναλυτικά στο 2^ο και στο 3^ο Παραδοτέο της Δράσης.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά Τομέα Προτεραιότητας, Κατηγορία Έργων, Θεματική Προτεραιότητα, Διαχειριστικές Δράσεις και Παραμέτρους, τόσο κατά περίπτωση όσο και συνολικά, αναλύονται στις επόμενες ενότητες.

3 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΦΥΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ «ΦΥΣΗ (NAT)» και «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – (BIO)»

Για το Υποπρόγραμμα LIFE «Περιβάλλον», τον Τομέα Προτεραιότητας «Φύση & Βιοποικιλότητα» ο οποίος περιέχει 2 κατηγορίες έργων σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE για την περίοδο 2018-2020, την Κατηγορία Έργων «ΦΥΣΗ – (NAT)» και την Κατηγορία Έργων «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – (BIO)», δομήθηκαν 2 online Google Forms ερωτηματολόγια, ένα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία έργων. Συνολικά οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»			
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΦΥΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ			
	Κατηγορία έργου: ΦΥΣΗ (NAT)	Κατηγορία έργου: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (BIO)	ΣΥΝΟΛΟ
Απαντήσεις στο Google Form Ερωτηματολόγιο	16	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ	16	0	16


Όπως παρουσιάζεται στο 3^ο Παραδοτέο, από ένα σύνολο 19 (100%) απεσταλθέντων ερωτηματολογίων στον Τομέα Προτεραιότητας Φύση Βιοποικιλότητας, απαντήθηκαν διακριτά τα 14 (73,6%), με 5 να μένουν αναπάντητα (26,3%). Παρόλα αυτά, εξ' αιτίας της απάντησης ορισμένων εξ' αυτών από διαφορετικούς φορείς, στις online Google Forms παρουσιάζονται συνολικά 16 απαντήσεις. Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη και οι 16 καθώς χρειάζεται η ετερογενής προσέγγιση των διαφορετικών φορέων ακόμη και για το ίδιο το έργο. Η αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων ανά Θεματική Προτεραιότητα, Διαχειριστικές Δράσεις και βαθμονομημένες Παραμέτρους Υλοποίησης, παρουσιάζεται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας. Η φιλοσοφία της ανάλυσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, εστιάζει στον καθορισμό των πιο σημαντικών βαθμονομημένων παραμέτρων, οι οποίες οδήγησαν κυρίως και στην χαμηλή επιτυχία της εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων των «Σχέδιων Μετά LIFE».

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 16 ερωτηματολόγια, κατατάσσονται όλα στην Θεματική Προτεραιότητα «Βελτίωση Καθεστώτος Διατήρησης»

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1: Σε ποια Θεματική Προτεραιότητα ανήκει το έργο σας (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

16 responses

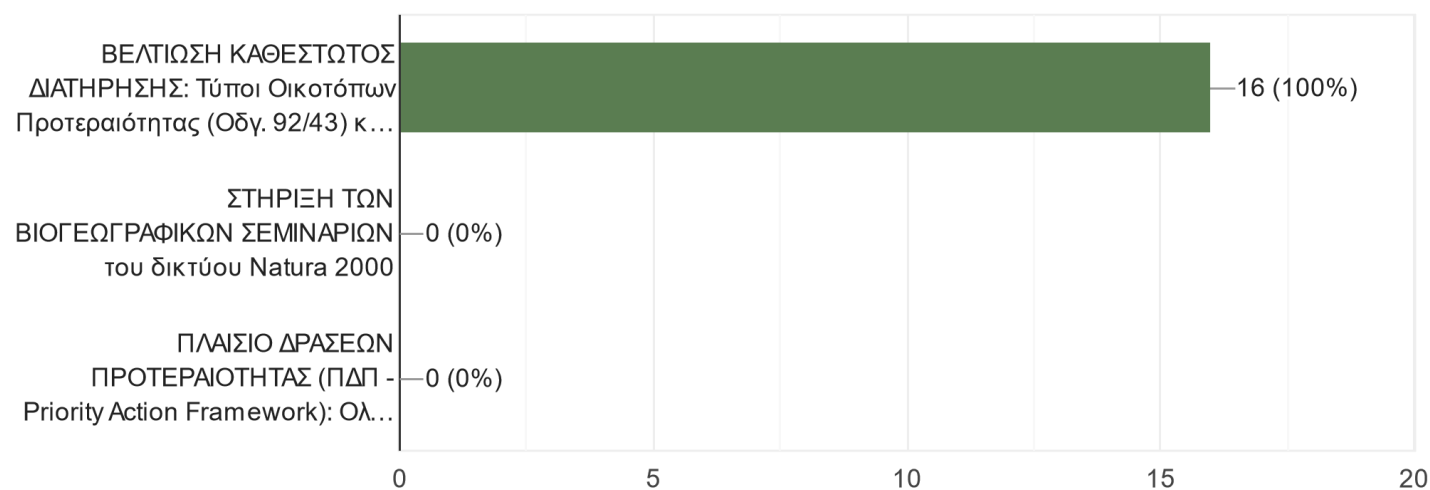

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας «Φύση & Βιοποικιλότητα» και της Κατηγορίας Έργων «ΦΥΣΗ»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» της κατηγορίας έργων ΦΥΣΗ, είναι οι εξής 14:

- Διαχείριση Υδάτων
- Διαχείριση Χερσαίων Εκτάσεων
- Διαχείριση Θαλάσσιων Εκτάσεων
- Αγροτική Διαχείριση & Διαχείριση Αλιείας
- Διαχείριση Δασών
- Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος
- Διαχείριση Ειδών
- Μετριασμός Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Συντήρηση & Λειτουργικότητα
- Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Διάχυση

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάληψη Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.

Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων


Το σύνολο των 14 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» της κατηγορίας έργων ΦΥΣΗ, παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Διαχείρισης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

16 responses

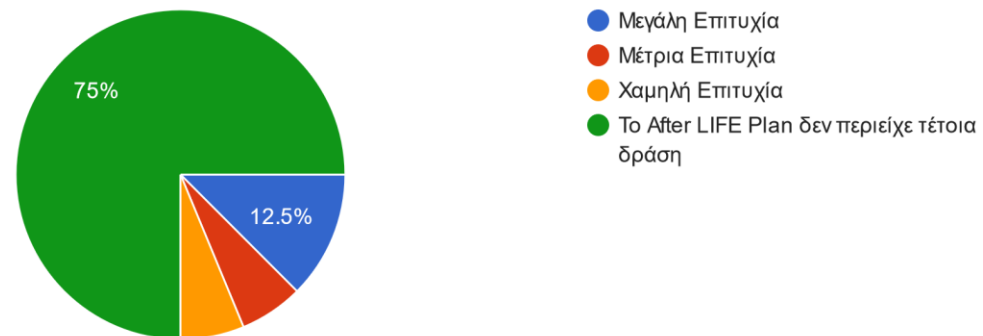


ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

16 responses

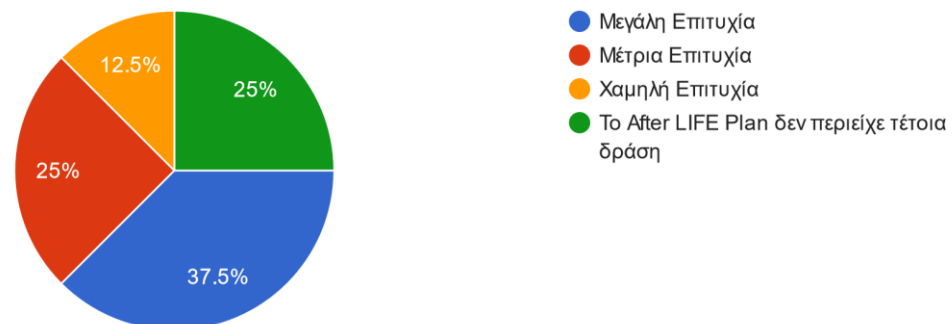


ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

16 responses

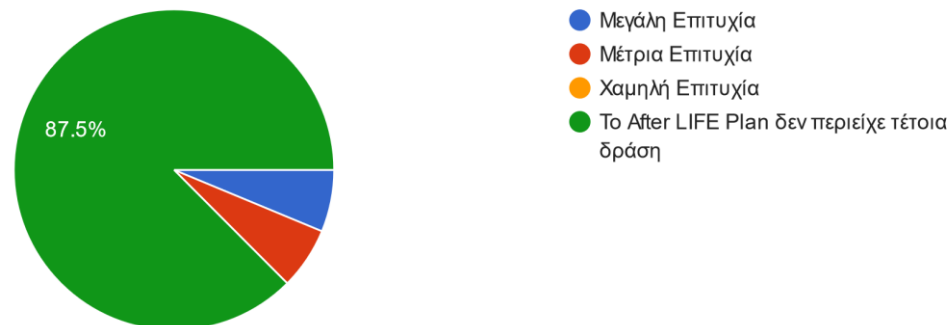


ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

16 responses

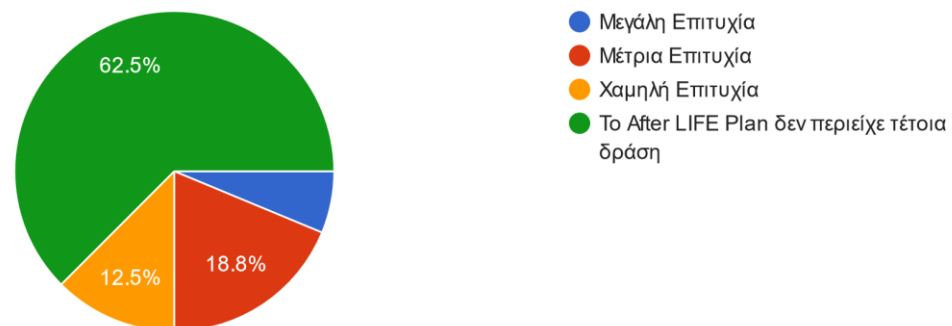


ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

16 responses

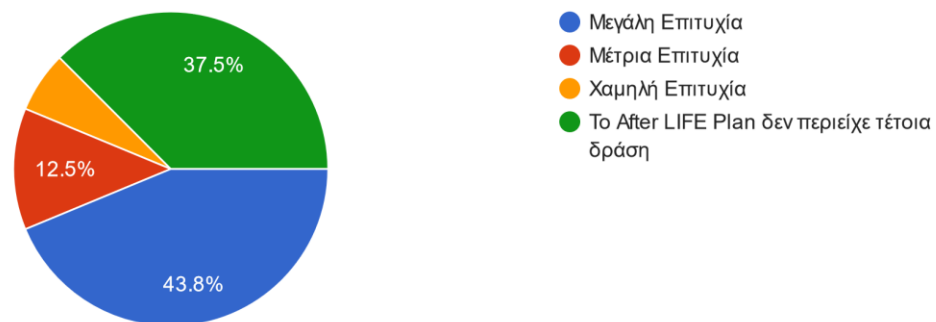


ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16 responses

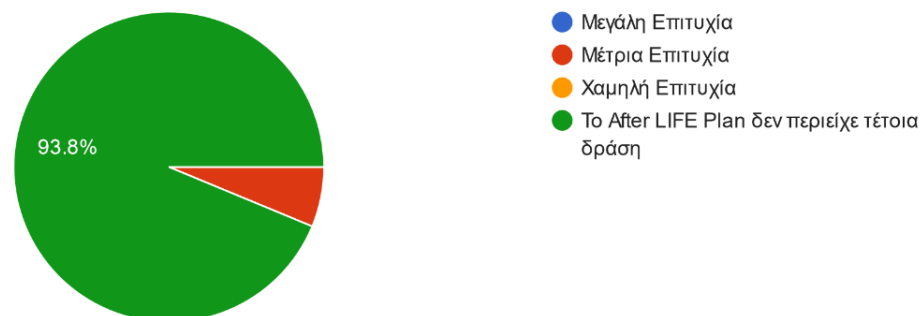


ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ


16 responses



ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


16 responses

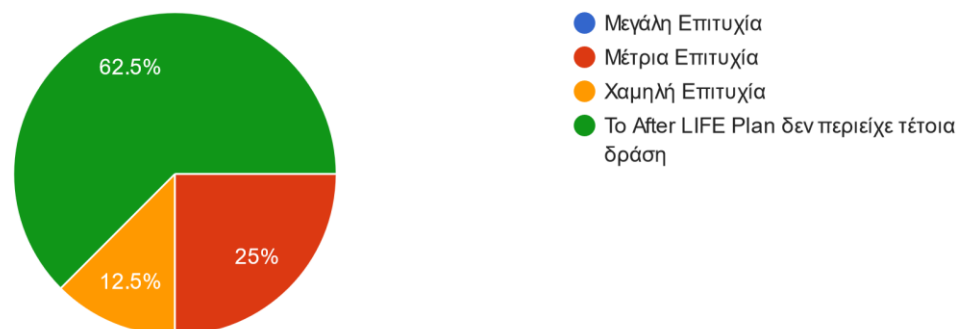

ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


16 responses

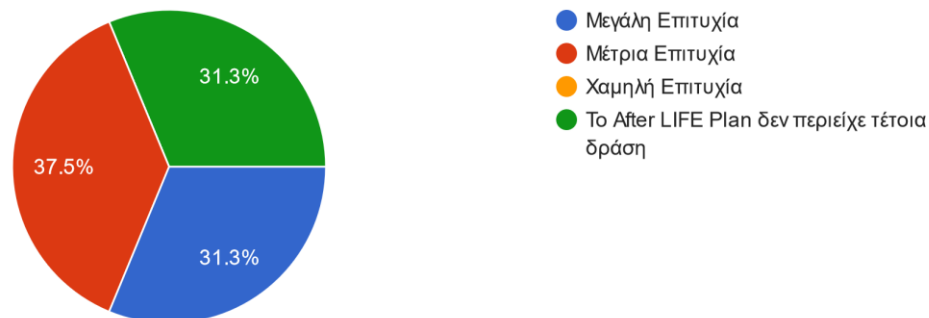

ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


16 responses

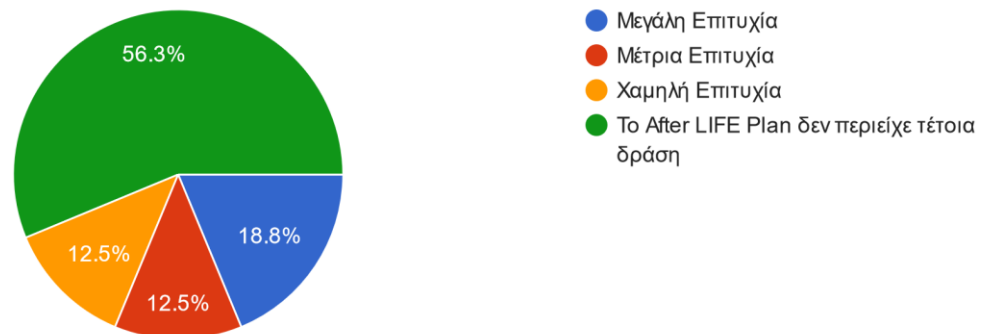

ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ


16 responses

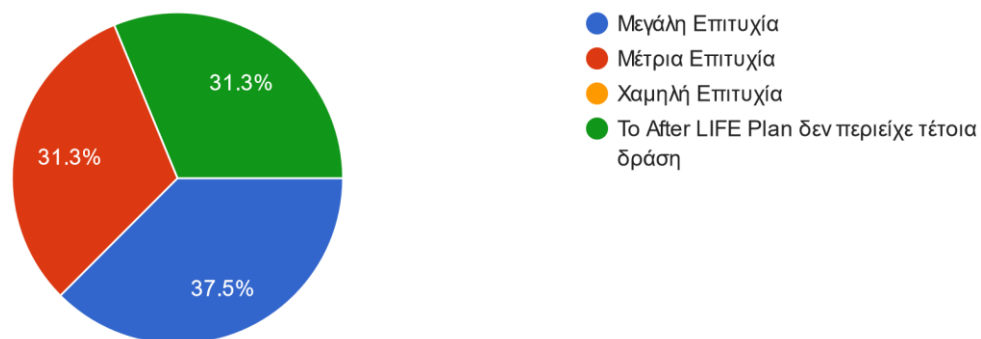

ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


16 responses

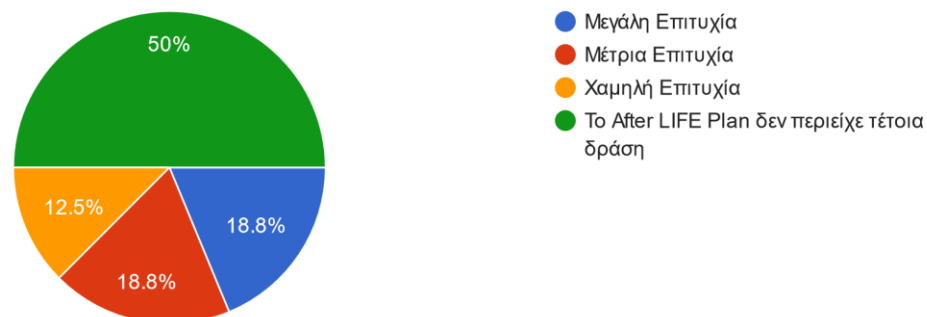

ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ


16 responses



ΕΡΓΑ «ΦΥΣΗ» - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

16 responses

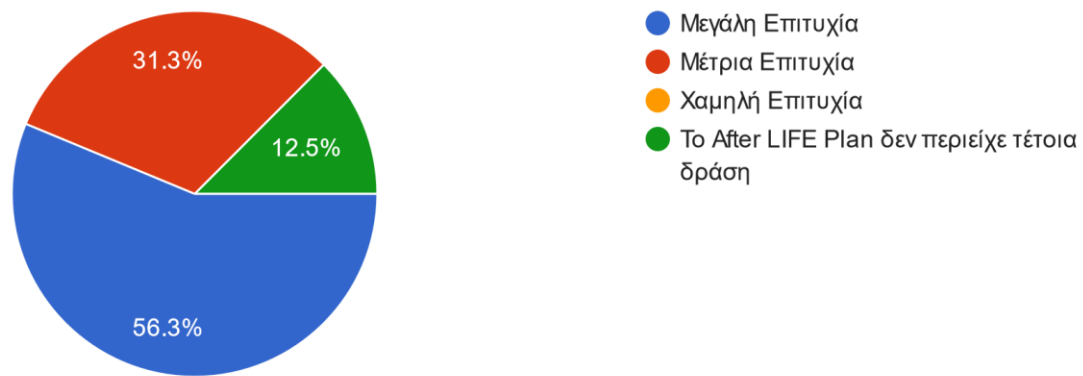

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» των Έργων «ΦΥΣΗ», είναι τα εξής:

Πίνακας 1: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΦΥΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	93,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	86,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	73,30%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	66,70%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	66,70%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	60%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	53,30%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	46,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	40%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	33,30%
ΕΡΕΥΝΑ	33,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	26,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ	13,30%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	13,30%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος απουσιάζει σχεδόν από όλα τα «Σχέδια Μετά LIFE» των έργων ΦΥΣΗ. Αυτό όμως είναι αναμενόμενο, καθώς περιμένουμε να δούμε τέτοιες διαχειριστικές δράσεις κυρίως σε έργα Περιβάλλοντος και Αποδοτικότητας Πόρων. Παρόλα αυτά η απουσία των Δράσεων **Διαχείριση Θαλάσσιων Εκτάσεων, Διαχείριση Υδάτων, και Διαχείριση Αλιείας** με τόσο υψηλά ποσοστά, καταδυνεκίζει ότι απαιτούνται περισσότερα έργα Φύσης με στόχευση στο θαλάσσιο χώρο, και αντίστοιχα στοχευμένα «Σχέδια Μετά LIFE».

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» έργων «ΦΥΣΗ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 2: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΦΥΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ	53,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	46,70%
ΕΡΕΥΝΑ	40%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	33,30%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	33,30%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	20%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	13,30%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	13,30%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	13,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	6,70%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	0%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0%

Πίνακας 3: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΦΥΣΗ», και ποσοστ看ση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	33,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	26,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ	26,70%
ΕΡΕΥΝΑ	26,70%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	26,70%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	26,70%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	20%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	20%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	13,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	6,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	6,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	6,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	6,70%

Πίνακας 4: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΦΥΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	13,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	13,30%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	13,30%
ΕΡΕΥΝΑ	13,30%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	13,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	6,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	6,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ	6,70%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	6,70%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	0%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, παρόλο που όπως φαίνεται στον τελευταίο πίνακα είναι μικρό το ποσοστό των «Σχεδίων Μετά LIFE» που περιείχαν Διαχειριστικές Δράσεις με Χαμηλή Επιτυχία, είναι σημαντικό να διερευνηθεί ποιες είναι οι παράμετροι που οδήγησαν σε αυτή τη χαμηλή επιτυχία. Βάσει του συνόλου της βαθμονόμησης της κάθε παραμέτρου υλοποίησης, η αρνητική συνεισφορά της κάθε παραμέτρου υλοποίησης που οδήγησε στην χαμηλή επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων του τελευταίου πίνακα, απεικονίζεται στον κάτωθι Πίνακα 5, ξεκινώντας από τις πιο αρνητικές παραμέτρους και την ποσόστωσή τους στο σύνολο των βαθμονομήσεων, φθίνοντας προς αυτές με την λιγότερο αρνητική επίδραση για την ολοκλήρωση της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία.

Πίνακας 5: Παρουσίαση των πιο αρνητικών (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ) Παράμετρων Υλοποίησης των Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΦΥΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το μέγεθος της βαθμονόμησης της αρνητικής συνεισφοράς που οδήγησε στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά


	<i>Ποσοστό αρνητικής συνεισφοράς στην εφαρμογή Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ	25,00%
ΕΥΡΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	25,00%
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	20,00%
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ	10,00%
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	10,00%
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΕΩΝ	5,00%
ΤΟΠΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ	5,00%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	0,00%

Συμπερασματικά, τεκμαίρεται πως οι Παράμετροι Υλοποίησης με την πιο αρνητική συνεισφορά που οδήγησαν στην Χαμηλή Επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων (Πίνακας 4) των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΦΥΣΗ», είναι η **Ανάληψη Ευθύνης Κάθε Συνεργαζόμενου Φορέα**, η **Εύρεση/Μόχλευση Οικονομικών Πόρων**, και τα **Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων**.

Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.


18.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;

16 responses



Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι οι **Φορείς Εμπορίου και Πώλησης**, οι **Παραγωγικοί Φορείς** (π.χ. γεωργοί, αλιείς, μικρομεσαίες), η **Τοπική Αυτοδιοίκηση** και η **Κεντρική Διοίκηση**.

18.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

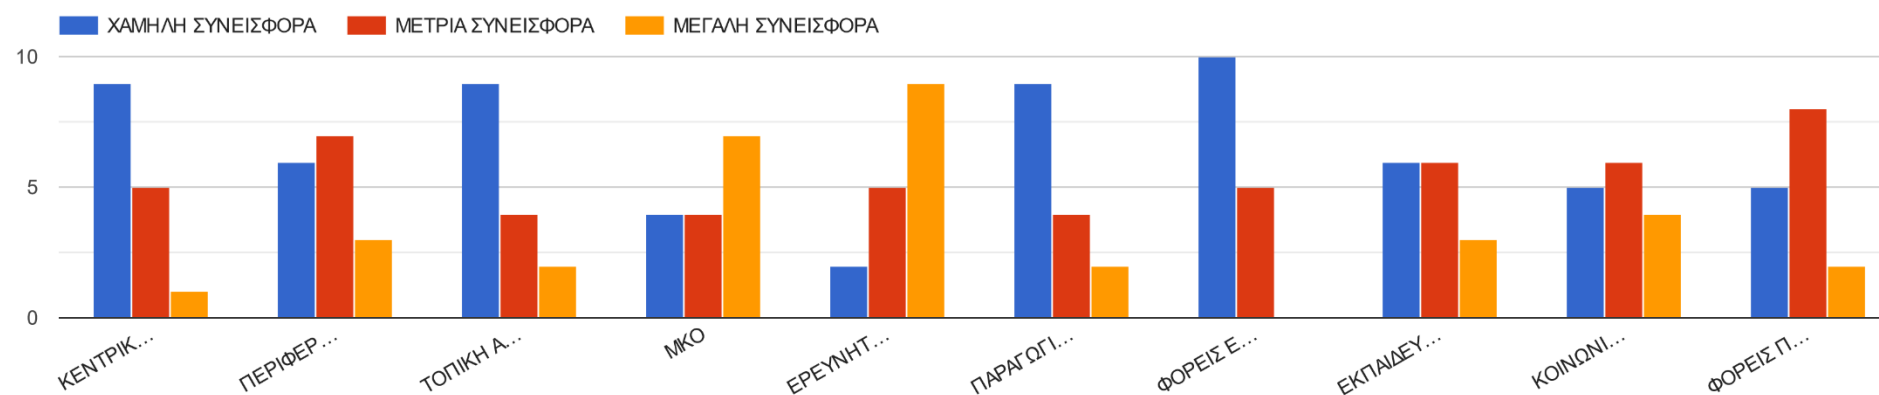

4 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»

Για το Υποπρόγραμμα LIFE «Περιβάλλον», τον Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» ο οποίος περιέχει 2 κατηγορίες έργων σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE για την περίοδο 2018-2020, την Κατηγορία Έργων «Διακυβέρνηση – (Governance)» και την Κατηγορία Έργων «Πληροφόρηση – (Information)», δομήθηκαν 2 online Google Forms ερωτηματολόγια, ένα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία έργων. Συνολικά οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»			
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ			
	Κατηγορία έργου: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (GOV)	Κατηγορία έργου: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (INFO)	ΣΥΝΟΛΟ
Απαντήσεις στο Google Form Ερωτηματολόγιο	4	3	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ	4	3	7

Όπως παρουσιάζεται στο 3^ο Παραδοτέο, διαμορφώθηκαν συνολικά 4 ερωτηματολόγια γενικά για τον Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση». Παρόλα αυτά, καθώς κάποια έργα τα οποία περιλαμβάνονται στον Τομέα Προτεραιότητας «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων», είχαν επίσης έντονο χαρακτήρα είτε Διακυβέρνησης είτε Πληροφόρησης, συμπληρώθηκαν από τους δικαιούχους τα ερωτηματολόγια και στους 2 Τομείς Προτεραιότητας. Συνεπώς, διαμορφώνονται 7 συνολικά απαντήσεις όπως διαφαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα. Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη και οι 7. Η αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων ανά Θεματική Προτεραιότητα, Διαχειριστικές Δράσεις και βαθμονομημένες Παραμέτρους Υλοποίησης, παρουσιάζεται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας. Η φιλοσοφία της ανάλυσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, εστιάζει στον καθορισμό των πιο σημαντικών βαθμονομημένων παραμέτρων, οι οποίες οδήγησαν κυρίως και στην χαμηλή επιτυχία της εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων των «Σχέδιων Μετά LIFE».


5 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – (GOVERNANCE)»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 4 ερωτηματολόγια για την κατηγορία έργων «Διακυβέρνηση», διαμορφώνουν βάσει των απαντήσεων 3 βασικούς άξονες στους οποίους ανήκουν τα έργα, με δεδομένο ότι κάποια έργα ανήκουν και σε περισσότερους από 1 άξονες. Η πλειοψηφία διαμορφώνει τη Βελτίωση Συστημάτων Πληροφοριών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1: Σε ποιον άξονα ανήκει το έργο σας (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

4 responses

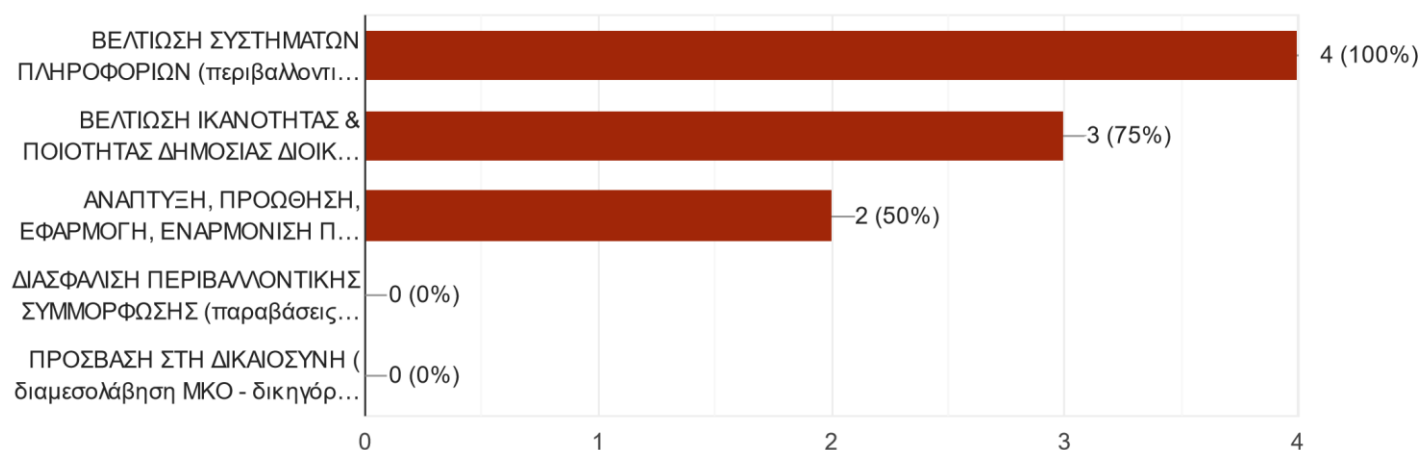

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» και της Κατηγορίας Έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» της κατηγορίας έργων ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, είναι οι εξής 14:

- Βελτίωση Συστημάτων Πληροφοριών
- Βελτίωση Ικανότητας & Ποιότητας Δημόσιας Διοίκησης
- Ανάπτυξη, Προώθηση, Εφαρμογή, Εναρμόνιση Προσεγγίσεων
- Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης
- Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
- Επικοινωνία, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση
- Εκπαίδευση & Βελτίωση Δεξιοτήτων
- Διάχυση Αποτελεσμάτων & Εκλαϊκευμένες Δημοσιεύσεις
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Διατήρηση, Συντήρηση & Λειτουργικότητα
- Προώθηση, Ενθάρρυνση, Ανάπτυξη

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάληψη Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.

Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων


Το σύνολο των 14 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» της κατηγορίας έργων ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Δ..., ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
4 responses

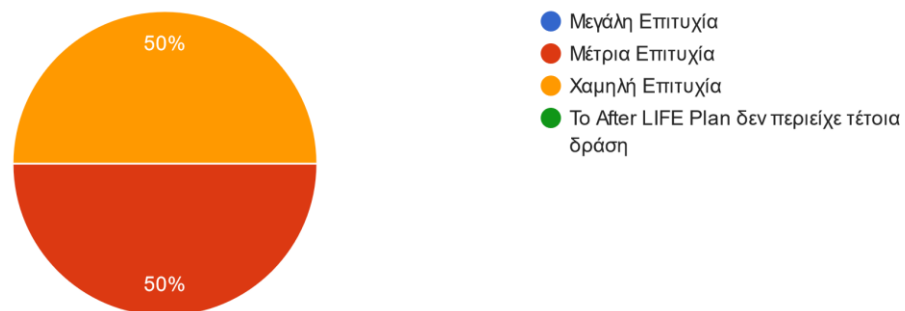

ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
4 responses

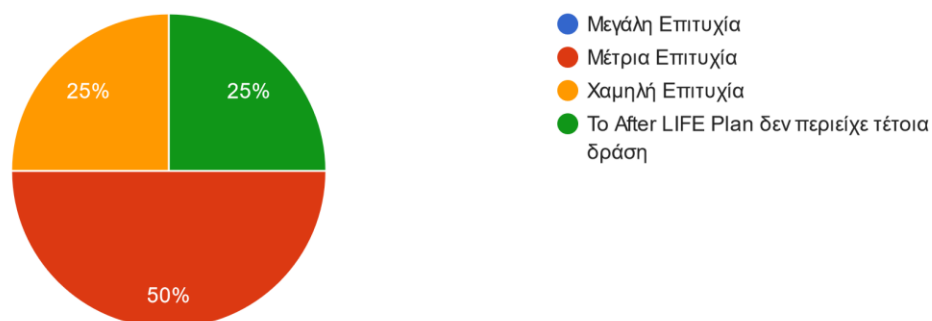


ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

4 responses

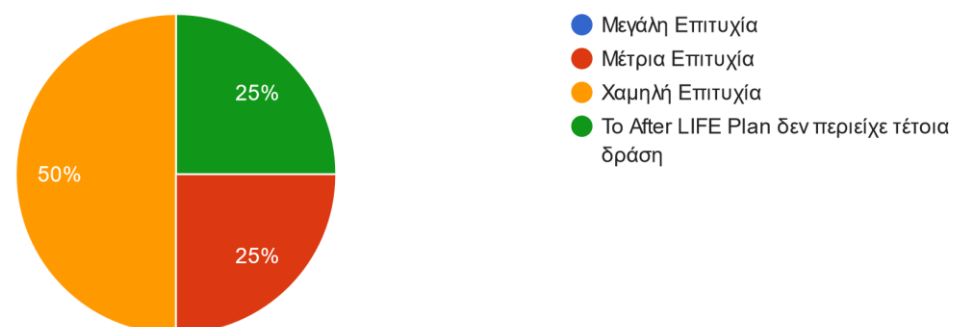


ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


4 responses

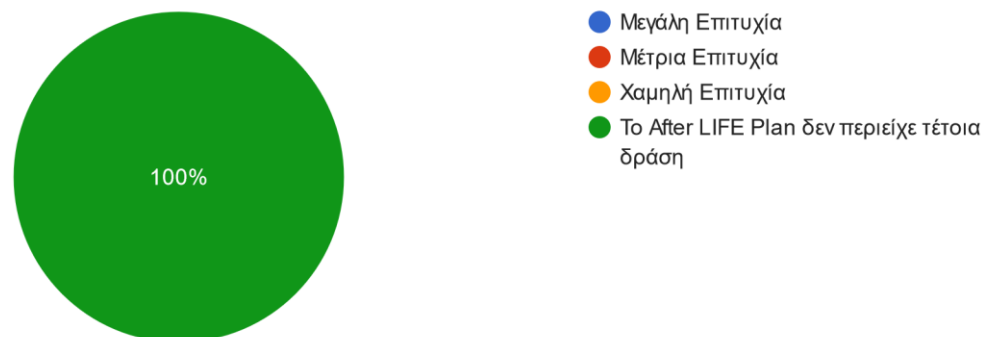

ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

4 responses

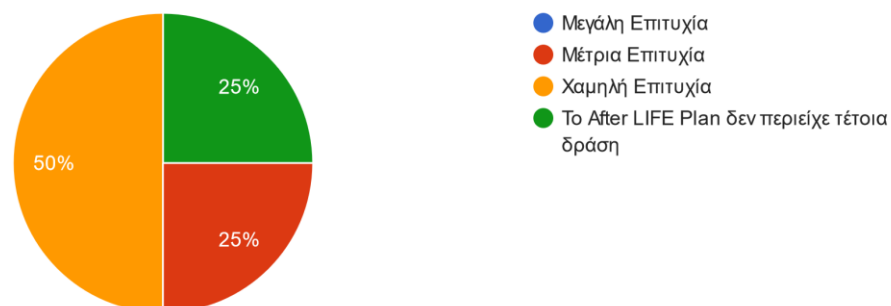

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4 responses

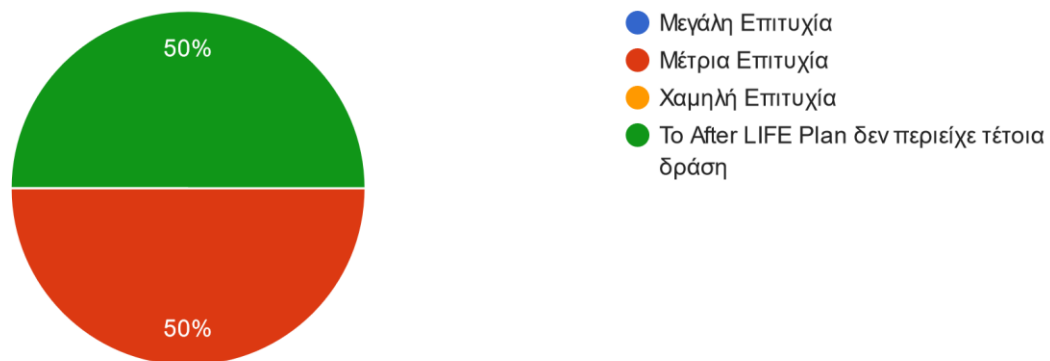

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» των Έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», είναι τα εξής:

Πίνακας 6: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	100%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	100%
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	75,00%
ΕΡΕΥΝΑ	75,00%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	50,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	50,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50,00%
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	50,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ	25,00%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	25,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	25,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	25,00%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	0,00%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η **Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη** και η **Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων** απουσιάζει από όλα τα «Σχέδια Μετά LIFE» των έργων ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Επίσης με υψηλά ποσοστά απουσιάζουν οι Διαχειριστικές Δράσεις **Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης**, και **Έρευνα**, γεγονός ου καταδυνκνείει ότι απαιτούνται περισσότερα έργα Διακυβέρνησης με στόχευση σε αυτές τις Διαχειριστικές Δράσεις, και αντίστοιχα στοχευμένα «Σχέδια Μετά LIFE».

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 7: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	25,00%
ΕΡΕΥΝΑ	25,00%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	0,00%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ	0,00%
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00%
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	0,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	0,00%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00%

Πίνακας 8: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», και ποσοστ看ση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	100%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	50,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ	50,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50,00%
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	50,00%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	25,00%
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	25,00%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	25,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	25,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	25,00%
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%

Πίνακας 9: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	50,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	50,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	50,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	50,00%
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	25,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ	25%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	25,00%
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00%
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	0,00%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, και καθώς φαίνεται στον τελευταίο πίνακα 9 πως 50% ποσοστό των «Σχεδίων Μετά LIFE» περιείχαν 4 Διαχειριστικές Δράσεις με Χαμηλή Επιτυχία, είναι σημαντικό να διερευνηθεί ποιες είναι οι παράμετροι που οδήγησαν σε αυτή τη χαμηλή επιτυχία. Βάσει του συνόλου της βαθμονόμησης της κάθε παραμέτρου υλοποίησης, η αρνητική συνεισφορά της κάθε παραμέτρου υλοποίησης που οδήγησε στην χαμηλή επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων του τελευταίου πίνακα, απεικονίζεται στον κάτωθι Πίνακα 10, ξεκινώντας από τις πιο αρνητικές παραμέτρους και την ποσόστωσή τους στο σύνολο των βαθμονομήσεων, φθίνοντας προς αυτές με την λιγότερο αρνητική επίδραση για την ολοκλήρωση της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία.


Πίνακας 10: Παρουσίαση των πιο αρνητικών (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ) Παράμετρων Υλοποίησης των Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το μέγεθος της βαθμονόμησης της αρνητικής συνεισφοράς που οδήγησε στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό αρνητικής συνεισφοράς στην εφαρμογή Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ	21,88%
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	21,88%
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΕΩΝ	18,75%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	18,75%
ΕΥΡΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	9,38%
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	6,25%
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ	3,13%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΤΟΠΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ	0,00%

Συμπερασματικά, τεκμαίρεται πως οι Παράμετροι Υλοποίησης με την πιο αρνητική συνεισφορά που οδήγησαν στην Χαμηλή Επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων (Πίνακας 9) των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», είναι η **Ανάληψη Ευθύνης Κάθε Συνεργαζόμενου Φορέα**, τα **Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων**, η **Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού**, η **Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων**, και τέλος η **Εύρεση/Μόχλευση Οικονομικών Πόρων**.


Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.

18.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;
4 responses



Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι οι **Περιφέρειες & Αποκεντρωμένες Διοικήσεις**.


18.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

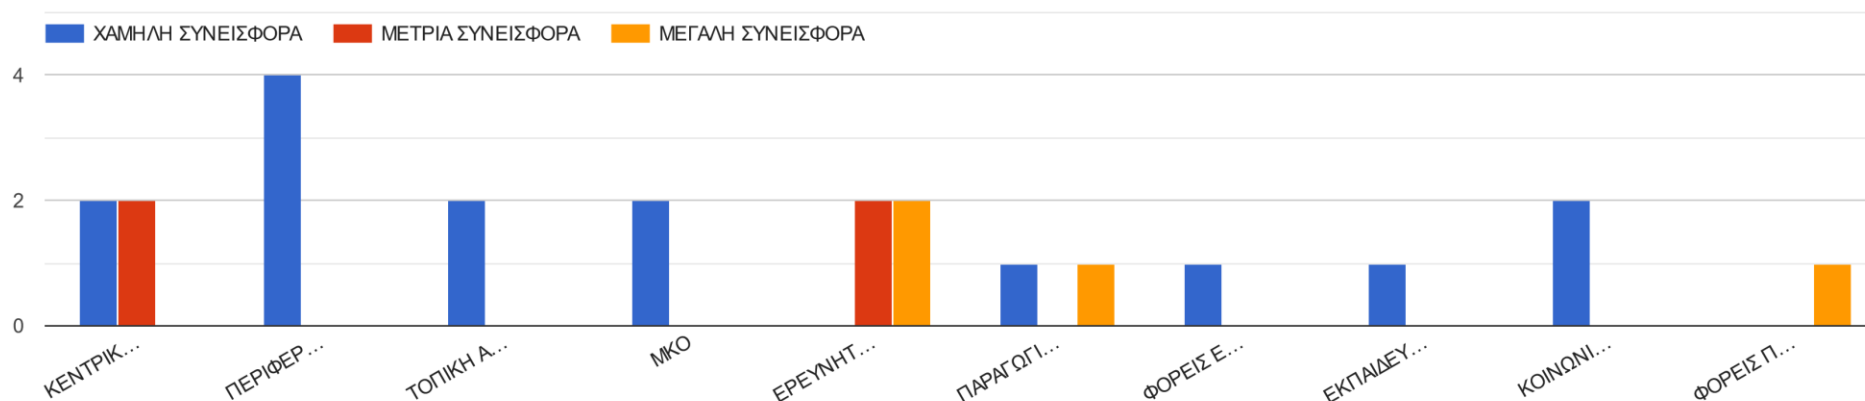

6 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – (INFORMATION)»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 3 ερωτηματολόγια για την κατηγορία έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», διαμορφώνουν βάσει των απαντήσεων 2 βασικούς άξονες στους οποίους ανήκουν τα έργα, με δεδομένο ότι κάποια έργα ανήκουν και σε περισσότερους από 1 άξονες. Η πλειοψηφία διαμορφώνει την Σύνδεση της Φύσης με τους Πολίτες.

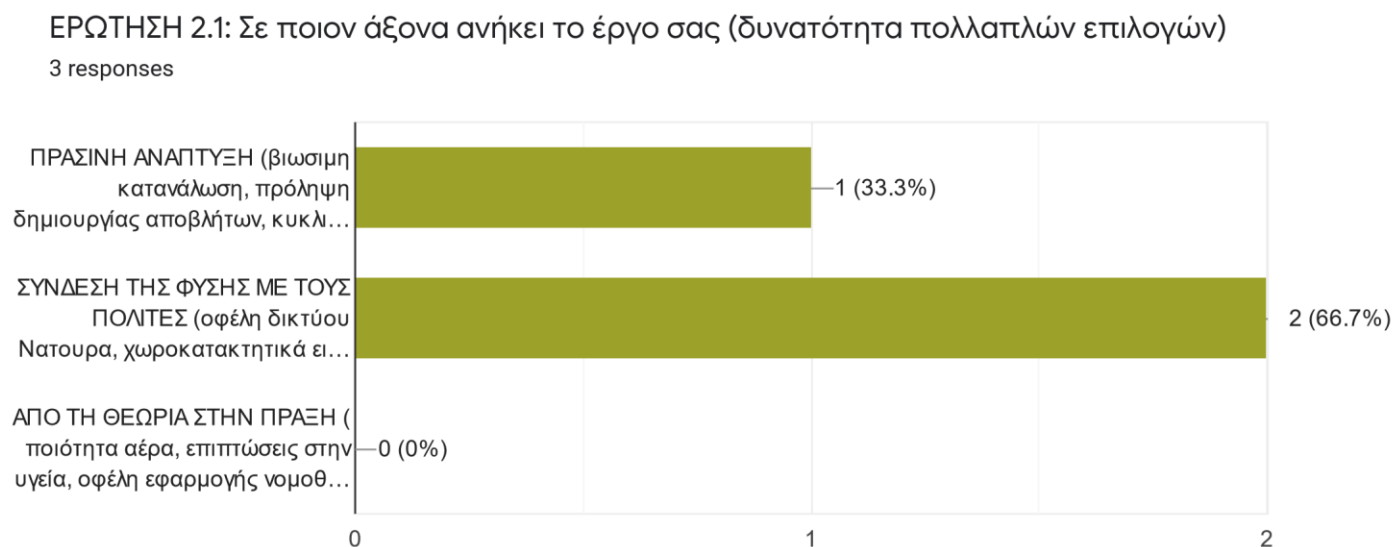

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» και της Κατηγορίας Έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» της κατηγορίας έργων ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, είναι οι εξής 10:

- Πράσινη Ανάπτυξη
- Επικοινωνία, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση
- Εκπαίδευση & Βελτίωση Δεξιοτήτων
- Διάχυση Αποτελεσμάτων & Εκλαϊκευμένες Δημοσιεύσεις
- Προώθηση, Ενθάρρυνση, Ανάπτυξη
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Διατήρηση, Συντήρηση & Λειτουργικότητα

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάληψη Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.


Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων

Το σύνολο των 10 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» της κατηγορίας έργων ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3 responses




ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

3 responses

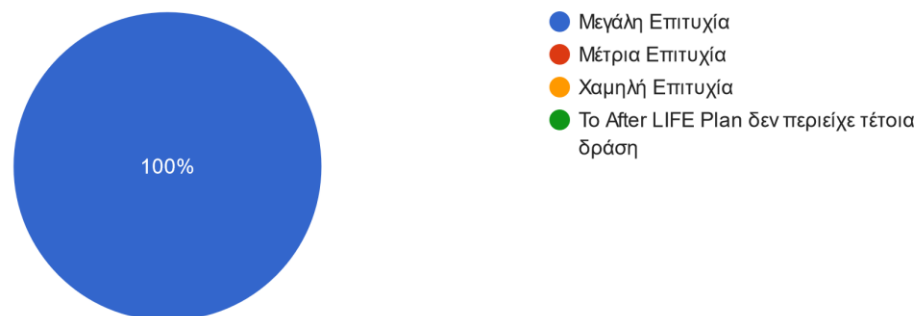


ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


3 responses



ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


3 responses

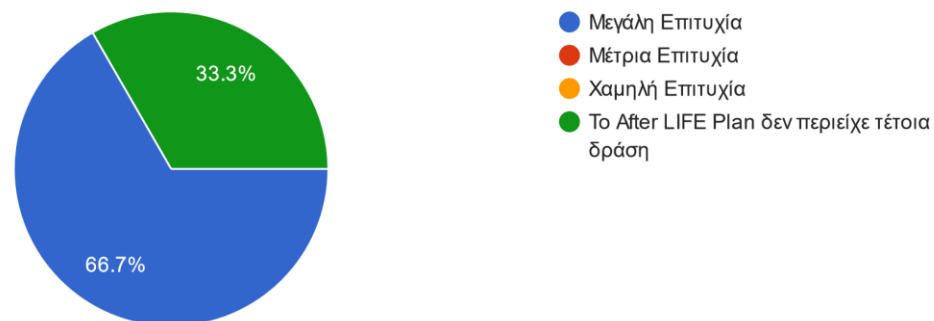

ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ


3 responses



ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


3 responses

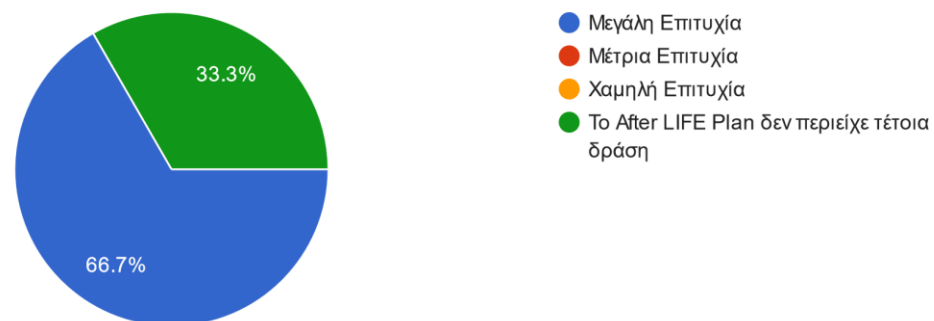

ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


3 responses



ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ


3 responses



ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3 responses

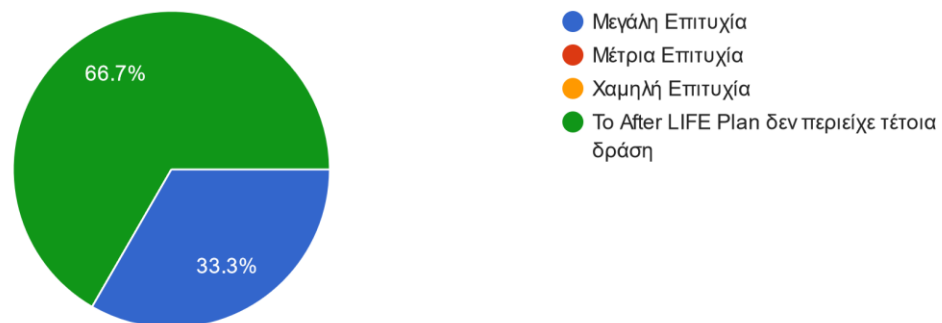


ΕΡΓΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

3 responses



- Μεγάλη Επιτυχία
- Μέτρια Επιτυχία
- Χαμηλή Επιτυχία
- Το After LIFE Plan δεν περιείχε τέτοια δράση

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» των Έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», είναι οι εξής:

Πίνακας 11: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	100,00%
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	66,70%
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	66,70%
ΕΡΕΥΝΑ	66,70%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	66,70%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	33,00%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	33,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	33,00%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η **Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων** απουσιάζει από όλα τα «Σχέδια Μετά LIFE» των έργων ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. Επίσης με υψηλά ποσοστά απουσιάζουν οι Διαχειριστικές Δράσεις **Πράσινη Ανάπτυξη, Προώθηση – Ενθάρρυνση – Ανάπτυξη, Έρευνα** και **Υποδομές Εξοπλισμός**.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 12: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	100,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	100,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	66,70%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	66,70%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	66,70%
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	33,00%
ΠΡΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	33,00%
ΕΡΕΥΝΑ	33,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	33,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%

Πίνακας 13: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	0,00%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	0,00%
ΠΡΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%


Πίνακας 14: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00%
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,00%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	0,00%
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	0,00%
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, και καθώς φαίνεται στον τελευταίο πίνακα 14 καμία Διαχειριστική Δράση δεν αξιολογήθηκε με Χαμηλή Επιτυχία, αλλά ούτε και με Μέτρια Επιτυχία (Πίνακας 13). Συνεπώς δεν ακολουθεί ανάλυση βαθμονόμησης των αρνητικών Παραμέτρων Υλοποίησης που δυνητικά θα είχαν οδηγήσει σε Χαμηλή Επιτυχία.


Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.

14.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;
3 responses



Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι οι **Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες & Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Παραγωγικοί Φορείς, Φορείς Εμπορίου, Φορείς Παροχής Υπηρεσιών.**

14.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

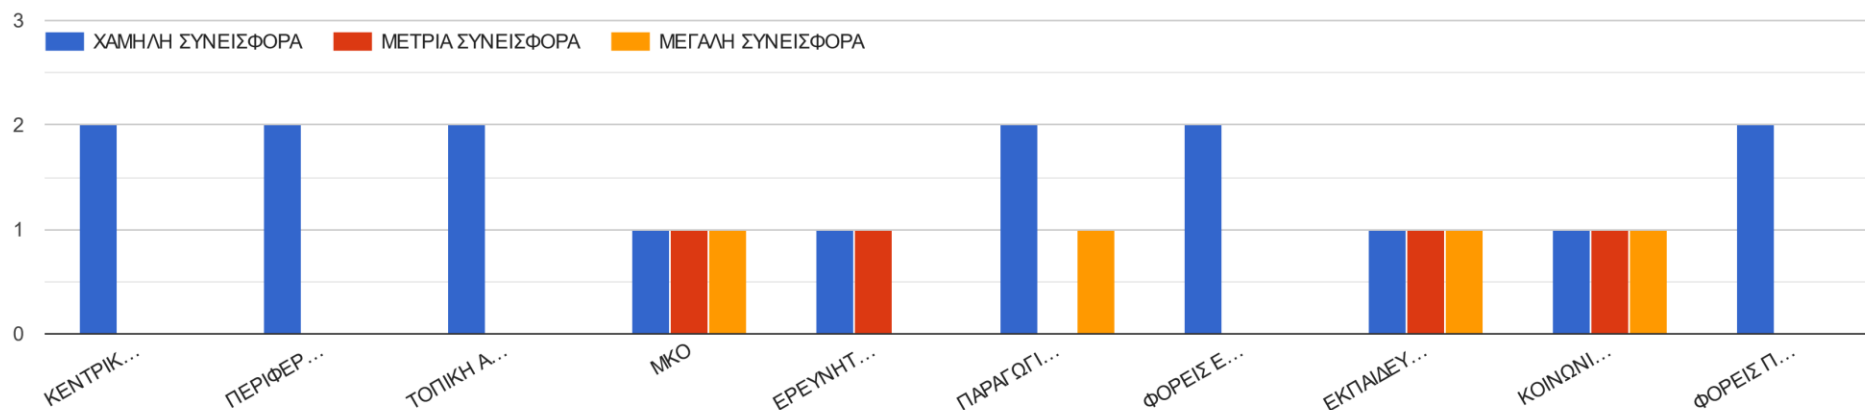

7 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

Το Υποπρόγραμμα LIFE «Δράση για το Κλίμα», περιέχει 3 Τομείς Προτεραιότητας σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE για την περίοδο 2018-2020, τον Τομέα Προτεραιότητας «Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής», τον Τομέα Προτεραιότητας «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», και τον Τομέα Προτεραιότητας «Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση». Καθώς στον Τομέα Προτεραιότητας «Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» δεν υπήρχε κανένα After LIFE Plan, δομήθηκαν 2 online Google Forms ερωτηματολόγια, ένα αντίστοιχα για κάθε Τομέα Προτεραιότητας για τον οποίο εντοπίστηκαν σχετικά After LIFE Plans. Συνολικά οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»			
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ			
	Τομέας: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ADAPTATION)	Κατηγορία έργου: Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (MITIGATION)	ΣΥΝΟΛΟ
Απαντήσεις στο Google Form Ερωτηματολόγιο	0	4	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ	0	4	4

Διαμορφώνονται 4 συνολικά απαντήσεις στα δομημένα ερωτηματολόγια όπως απεικονίζεται και στον ανωτέρω πίνακα, αποκλειστικά στον Τομέα Προτεραιότητας «Μετριασμός στην Κλιματική Αλλαγή». Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη και οι 4. Η αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων ανά Θεματική Προτεραιότητα, Διαχειριστικές Δράσεις και βαθμονομημένες Παραμέτρους Υλοποίησης, παρουσιάζεται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας. Η φιλοσοφία της ανάλυσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, εστιάζει στον καθορισμό των πιο σημαντικών βαθμονομημένων παραμέτρων, οι οποίες οδήγησαν κυρίως και στην χαμηλή επιτυχία της εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων των «Σχέδιων Μετά LIFE».


8 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 4 ερωτηματολόγια για Τομέα Προτεραιότητας «Μετριασμός στην Κλιματική Αλλαγή», διαμορφώνουν βάσει των απαντήσεων 3 βασικούς άξονες στους οποίους στοχεύουν τα «Σχέδια Μετά LIFE», με δεδομένο ότι κάποια έργα ανήκουν και σε περισσότερους από 1 άξονες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, σε ποιο πεδίο στοχεύει το έργο σας;

4 responses

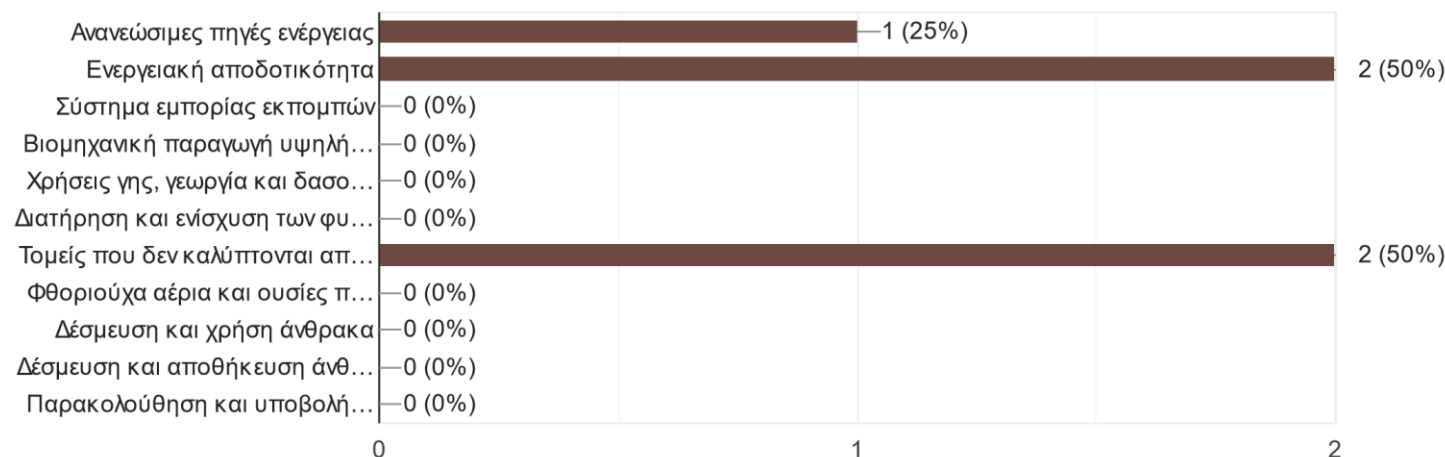

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας «Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», είναι οι εξής 14:

- Ανάπτυξη – Εφαρμογή – Βελτίωση Πολιτικής & Νομοθεσίας με σκοπό τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
- Διαχείριση Γης
- Αγροτική Διαχείριση
- Διαχείριση Δασών
- Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Υλοποίηση καινοτόμων λύσεων & τεχνολογική ετοιμότητα
- Αξιοποίηση & Ανακύκλωση φθοριούχων αερίων
- Καθαρισμός & λειτουργία συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών βιομηχανικής παραγωγής
- Υποβολή εκθέσεων, λογιστική καταγραφή εκπομπών, παρακολούθηση, ανάλυση, αξιολόγηση
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Διατήρηση, Συντήρηση & Λειτουργικότητα
- Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Διάχυση

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάληψη Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.


Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων

Το σύνολο των 14 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με σκοπό τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ...ό τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

4 responses

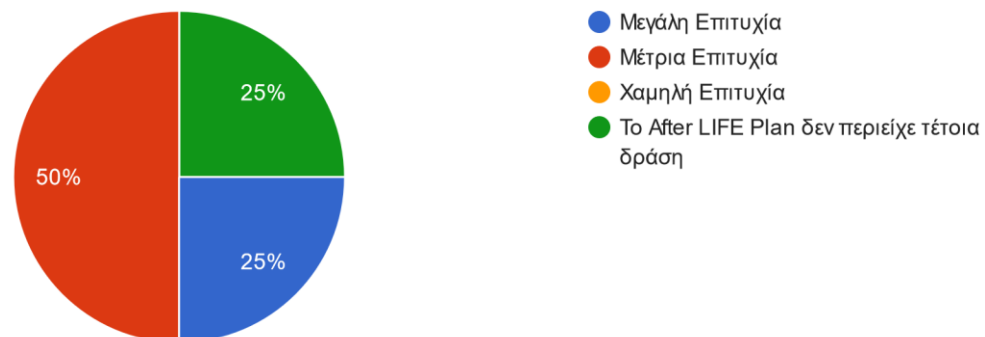


ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠ...ΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ε...ΠΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
4 responses

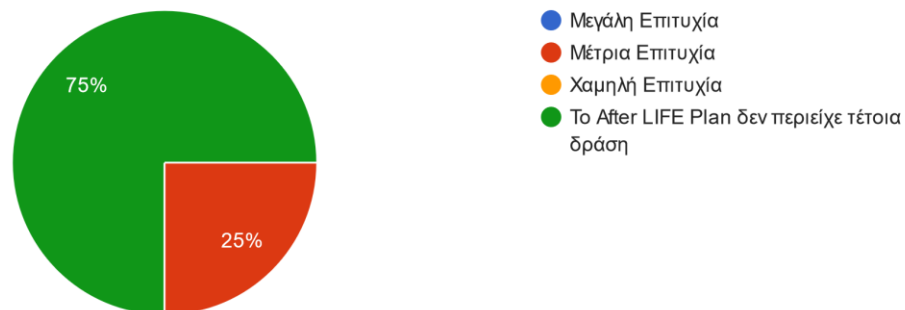

ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
4 responses




ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ


4 responses

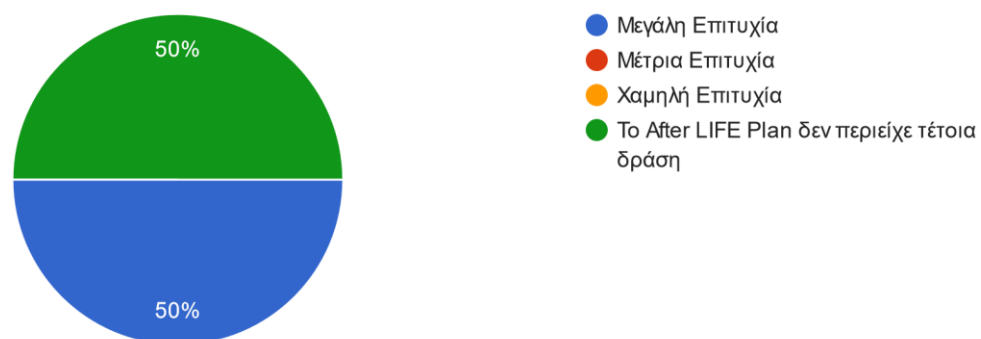

ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


4 responses



ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ


4 responses

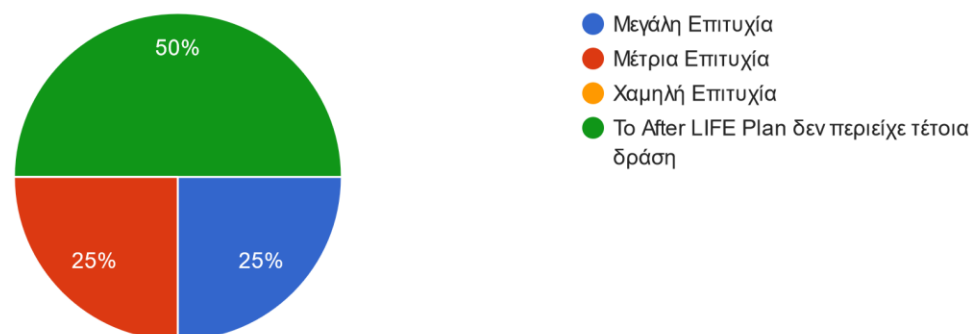

ΕΡΓΑ «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

4 responses



- Μεγάλη Επιτυχία
- Μέτρια Επιτυχία
- Χαμηλή Επιτυχία
- Το After LIFE Plan δεν περιείχε τέτοια δράση

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», είναι τα εξής:

Πίνακας 15: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	100,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	100,00%
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	100,00%
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	100,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με σκοπό τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	75,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	75,00%
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	75,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	50,00%
ΕΡΕΥΝΑ	50,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	50,00%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ	25%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	25%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η **Αγροτική Διαχείριση, Διαχείριση Δασών, Αξιοποίηση & Ανακύκλωση Φθοριούχων Αερίων** και ο **Καθορισμός & Λειτουργία Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Βιομηχανικής Παραγωγής** απουσιάζει από όλα τα «Σχέδια Μετά LIFE» των «Σχεδίων Μετά LIFE» ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Επίσης με υψηλά ποσοστά απουσιάζουν οι Διαχειριστικές Δράσεις **Ανάπτυξη – Εφαρμογή – Βελτίωση Πολιτικής & Νομοθεσίας με Σκοπό τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, Διαχείριση Γης**, και η **Υποβολή Εκθέσεων – Λογιστική Καταγραφή Εκπομπών – Παρακολούθηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση**, γεγονός που καταδυναμώνει ότι απαιτούνται περισσότερα έργα Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής με στόχευση σε αυτές τις Διαχειριστικές Δράσεις, και αντίστοιχα στοχευμένα «Σχέδια Μετά LIFE».

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» έργων «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 16: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΕΡΕΥΝΑ	50,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	50,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με σκοπό τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	25,00%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ	25,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	25,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	25,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	25,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	0,00%
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	0,00%
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00%
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	0,00%

Πίνακας 17: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ	50,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	50,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	50,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	25,00%
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	25%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	25,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με σκοπό τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	0,00%
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	0,00%
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%

Πίνακας 18: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	25,00%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με σκοπό τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	0,00%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ	0,00%
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	0,00%
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00%
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, και καθώς φαίνεται στον τελευταίο Πίνακα 18 μόνο μία Διαχειριστική Δράση καταγράφηκε με Χαμηλή Επιτυχία, η Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση. Καμία Παράμετρος Υλοποίησης δεν χαρτογραφήθηκε με Πάρα Πολύ αρνητική συνεισφορά, αλλά ορισμένες βαθμονομήθηκαν με Πολύ αρνητική συνεισφορά. Η παρουσίαση του συνόλου βαθμονόμησης απεικονίζεται στον κάτωθι Πίνακα 19.


Πίνακας 19: Παρουσίαση των πιο αρνητικών (ΠΟΛΥ) Παράμετρων Υλοποίησης των Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το μέγεθος της βαθμονόμησης της αρνητικής συνεισφοράς που οδήγησε στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό αρνητικής συνεισφοράς στην εφαρμογή Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ	14,29%
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ	14,29%
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	14,29%
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	14,29%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	14,29%
ΤΟΠΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ	14,29%
ΕΥΡΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	14,29%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΕΩΝ	0,00%

Συμπερασματικά, τεκμαίρεται πως ένα σύνολο 7 Παράμετρων Υλοποίησης μοιράζονται με την ίδια ποσόστωση την αρνητική συνεισφορά τους που οδήγησαν στην Χαμηλή Επιτυχία της Διαχειριστικής Δράσης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ» (Πίνακας 18) των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων «ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ».


Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.

18.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;
4 responses



Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι οι **Περιφέρειες & Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών.**

18.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

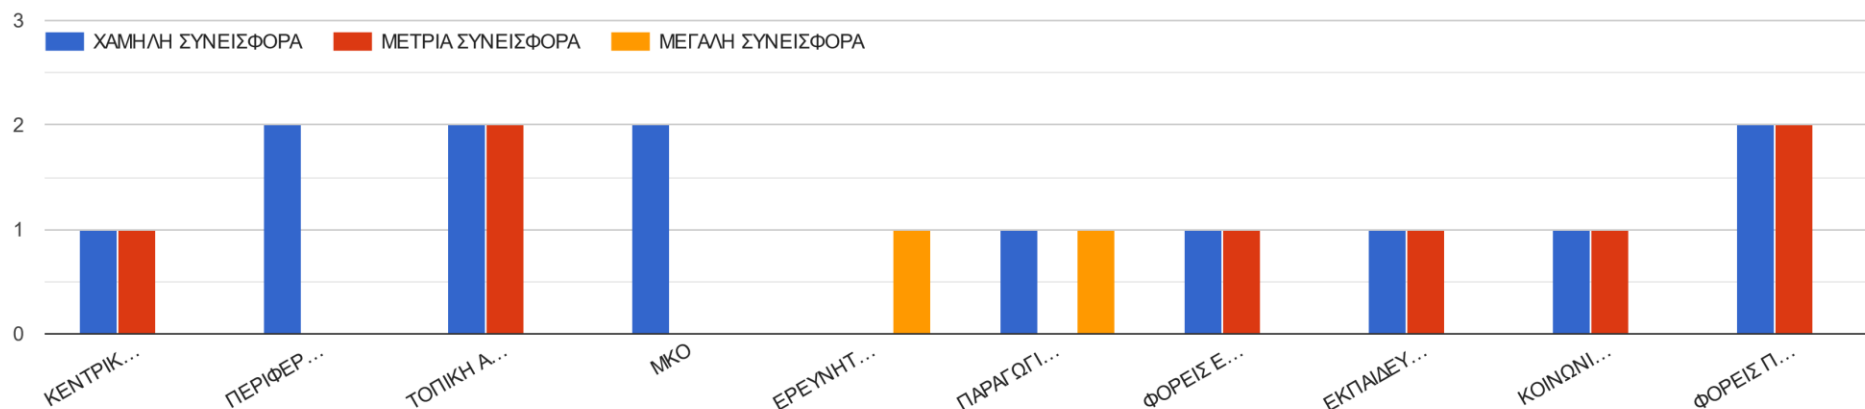

9 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠÓΡΩΝ»

Το Υποπρόγραμμα LIFE «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων», περιλαμβάνει 5 διακριτούς Τομείς Προτεραιότητας: (1) Τομέας Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ», (2) Τομέας Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», (3) Τομέας Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ», (4) Τομέας Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», (5) Τομέας Προτεραιότητας «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ», σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE για την περίοδο 2018-2020. Αντίστοιχα συνεπώς, δομήθηκαν 5 διακριτά online Google Forms ερωτηματολόγια, ένα αντίστοιχα για κάθε θεματική προτεραιότητα έργων. Συνολικά οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν ως εξής:

	Τομέας Προτεραιότητας: ΝΕΡΟ	Τομέας Προτεραιότητας: ΑΠΟΒΛΗΤΑ	Τομέας Προτεραιότητας: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ	Τομέας Προτεραιότητας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Τομέας Προτεραιότητας: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Απαντήσεις στο Google Form Ερωτηματολόγιο	2	7	5	1	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ	2	7	5	1	0	15

Όπως παρουσιάζεται στο 3^ο Παραδοτέο, από ένα σύνολο 26 (100%) απεσταλθέντων ερωτηματολογίων στο Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων», απαντήθηκαν διακριτά τα 14 (53,8%), με 12 να μένουν αναπάντητα (46,15%). Παρόλα αυτά, εξ' αιτίας της απάντησης ορισμένων εξ' αυτών από διαφορετικούς φορείς, στις online Google Forms παρουσιάζονται συνολικά 15 απαντήσεις. Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη και οι 15 καθώς χρειάζεται η ετερογενής προσέγγιση των διαφορετικών φορέων ακόμη και για το ίδιο το έργο. Η αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων ανά Θεματική Προτεραιότητα, Διαχειριστικές Δράσεις και βαθμονομημένες Παραμέτρους Υλοποίησης, παρουσιάζεται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας. Η φιλοσοφία της ανάλυσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, εστιάζει στον καθορισμό των πιο σημαντικών βαθμονομημένων παραμέτρων, οι οποίες οδήγησαν κυρίως και στην χαμηλή επιτυχία της εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων των «Σχέδιων Μετά LIFE».

Σημειώνεται πως, επειδή στον Τομέα Προτεραιότητας «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ» δεν δόθηκε καμία απάντηση, δεν παρατίθεται ανάλυση.

Αντίστοιχα, στον Τομέα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» παρόλο που δόθηκε μία απάντηση, καθώς κατέγραψε όλες τις Διαχειριστικές Δράσεις είτε να απουσιάζουν από το «Σχέδιο Μετά LIFE», είτε ότι ολοκληρώθηκαν με Μεγάλη Επιτυχία, δεν παρατίθεται παρουσίαση ούτε και ανάλυση των αποτελεσμάτων.


10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΝΕΡΟ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 2 ερωτηματολόγια, κατατάσσονται στις κάτωθι Θεματικές Προτεραιότητες:

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1: Σε ποια Θεματική Προτεραιότητα ανήκει το έργο σας (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

2 responses

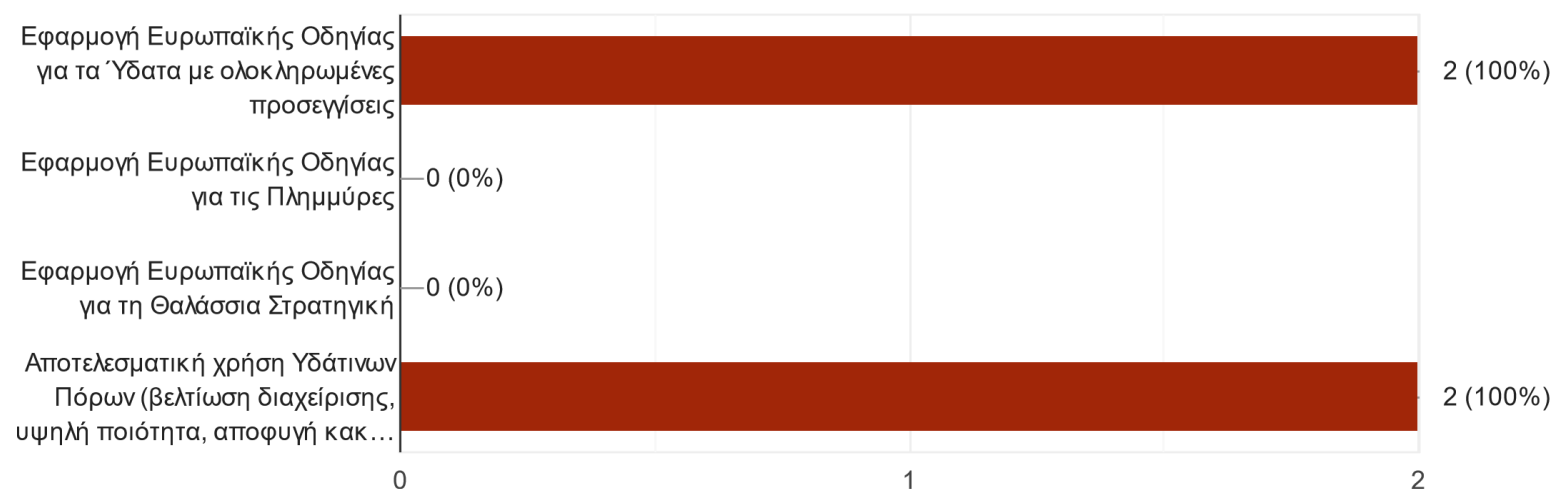

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας «NEPO»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «NEPO», είναι οι εξής 11:

- Διαχείριση Υδάτων
- Διαχείριση Μεταφορών
- Αγροτική Διαχείριση & Διαχείριση Αλιείας
- Μετριασμός Μόλυνσης
- Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Συντήρηση & Λειτουργικότητα
- Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Διάχυση

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάλυση Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.

Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων


Το σύνολο των 11 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «NEPO», παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «NEPO» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

2 responses




- Μεγάλη Επιτυχία
- Μέτρια Επιτυχία
- Χαμηλή Επιτυχία
- Το After LIFE Plan δεν περιείχε τέτοια δράση

ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


2 responses



ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

2 responses




ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

2 responses

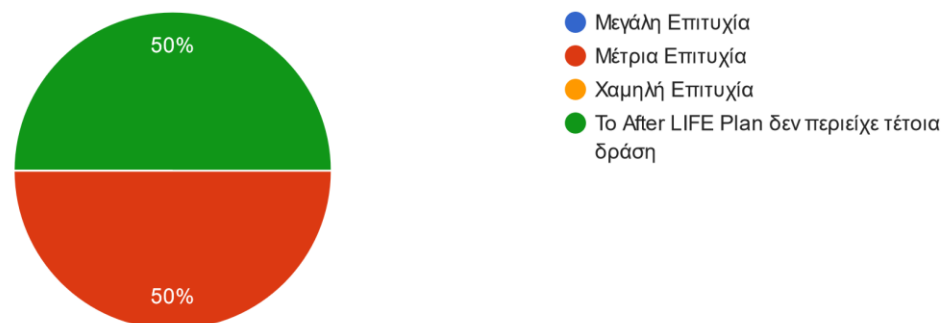


ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ


2 responses

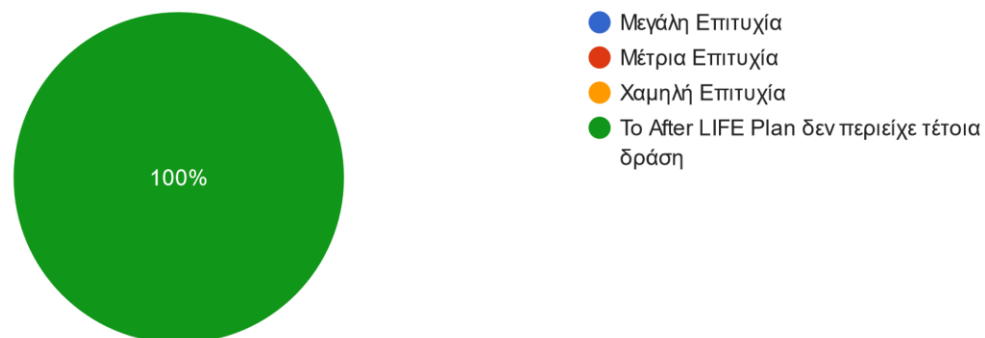

ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


2 responses



ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


2 responses

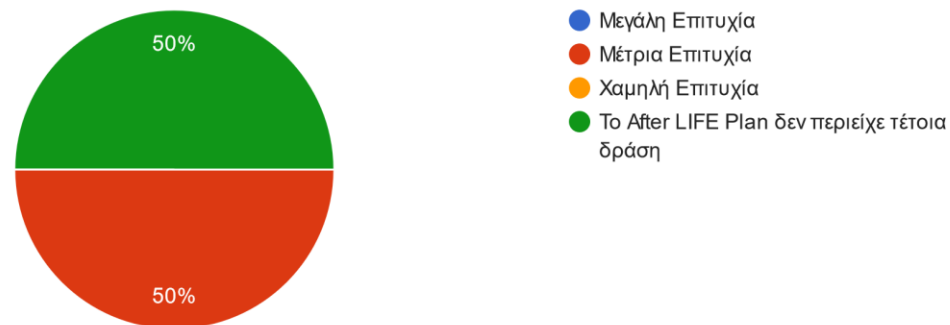

ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ


2 responses



ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2 responses




ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

2 responses




ΕΡΓΑ «ΝΕΡΟ» - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

2 responses

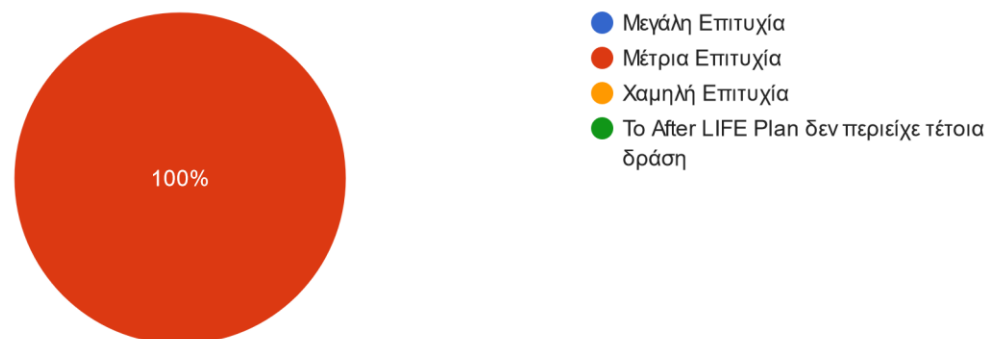

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» των Έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ», είναι τα εξής:

Πίνακας 20: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ», και ποσοστ看ση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	100,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	100,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	100,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	100,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	50,00%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	50,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	50,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	50,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η **Διαχείριση Μεταφορών**, η **Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών**, η **Παρακολούθηση – Επιτήρηση – Καταγραφή – Ανατροφοδότηση**, και οι **Υποδομές – Εξοπλισμός**, απουσιάζουν από όλα τα «Σχέδια Μετά LIFE» των έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ». Δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια αυτό μία κρίσιμη διαπίστωση, καθώς αφορά μόνο 2 «Σχέδια Μετά LIFE», και το δείγμα είναι μικρό. Παρόλα αυτά, για την 20ετία 2000-2020 απεικονίζει μία πραγματική τάση, έστω και με μικρό στατιστικό δείγμα.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 21: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΕΡΕΥΝΑ	50,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0,00%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Πίνακας 22: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	100,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	100,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	50,00%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	50,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	50,00%
ΕΡΕΥΝΑ	50,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	50,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%


Πίνακας 23: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» των έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΝΕΡΟ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0,00%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, παρόλο που όπως φαίνεται στον τελευταίο Πίνακα 23 είναι μηδενικό το ποσοστό των «Σχεδίων Μετά LIFE» που περιείχαν Διαχειριστικές Δράσεις με Χαμηλή Επιτυχία. Συνεπώς δεν ακολουθεί βαθμονόμησης της κάθε παραμέτρου υλοποίησης καθώς δεν υπάρχουν δράσεις με Χαμηλή Επιτυχία.


Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.

15.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;
2 responses

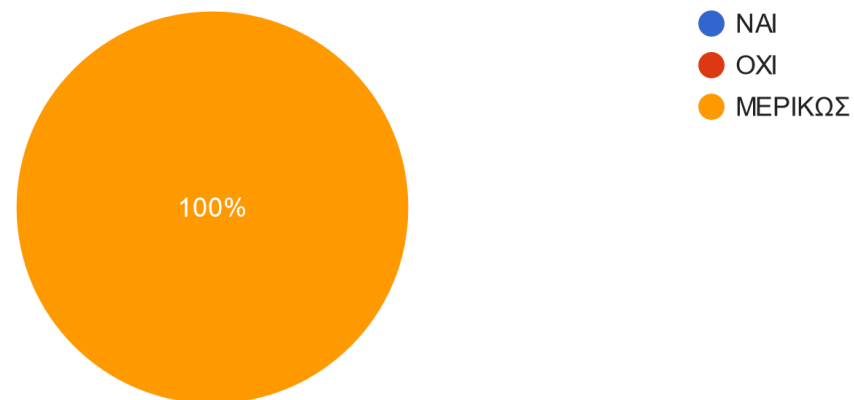

Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι οι **Φορείς Εμπορίου, Μεταποίησης και Πώλησης Προϊόντων**.

15.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

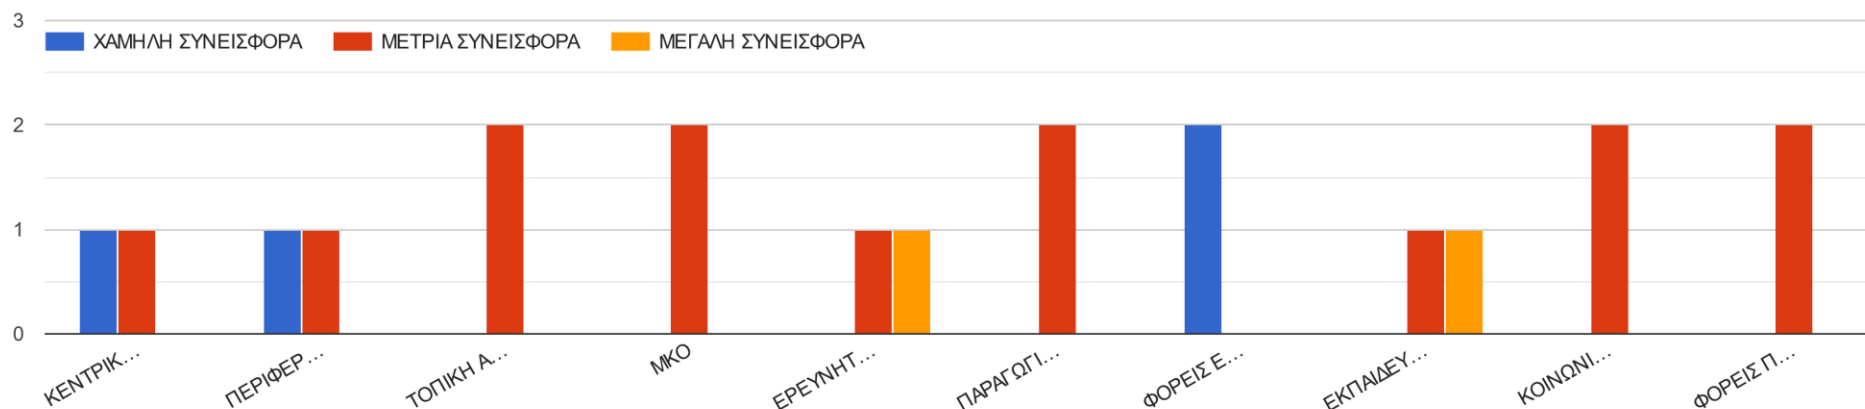


11 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 7 ερωτηματολόγια, κατατάσσονται στις κάτωθι Θεματικές Προτεραιότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1: Σε ποια Θεματική Προτεραιότητα ανήκει το έργο σας (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

7 responses

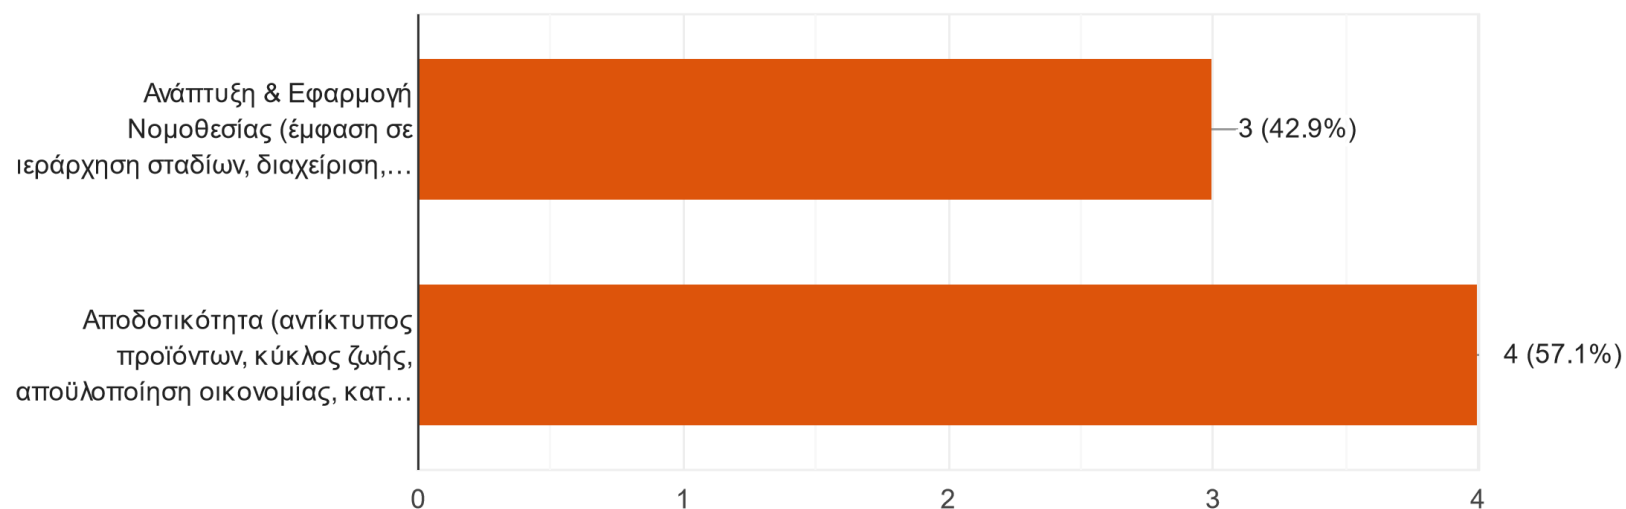

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», είναι οι εξής 13:

- Διαχείριση Γης
- Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος
- Μετριασμός Μόλυνσης
- Ανακύκλωση & Διαχείριση – Οργανικά Βιο-Απόβλητα
- Ανακύκλωση & Διαχείριση – Στερεά Απόβλητα
- Ανακύκλωση & Διαχείριση – Εργοστασιακά Βιομηχανικά Βιο-Απόβλητα
- Διαχείριση Χημικών
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Συντήρηση & Λειτουργικότητα
- Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Διάχυση

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάλυση Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.

Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων


Το σύνολο των 13 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ


7 responses

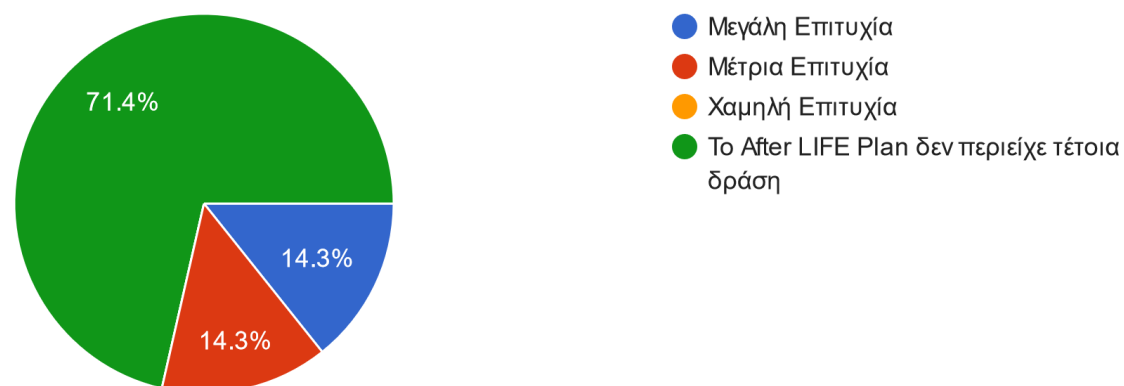

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


7 responses

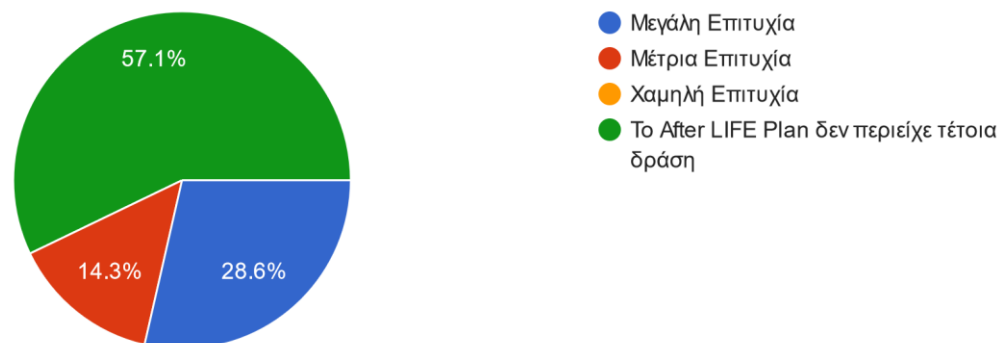

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ


7 responses

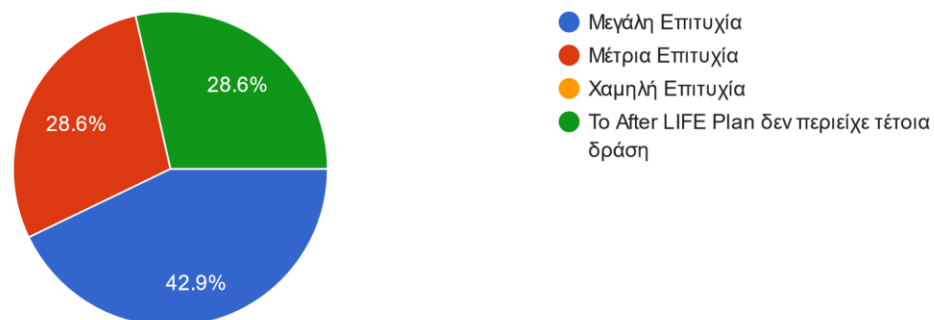

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα


7 responses

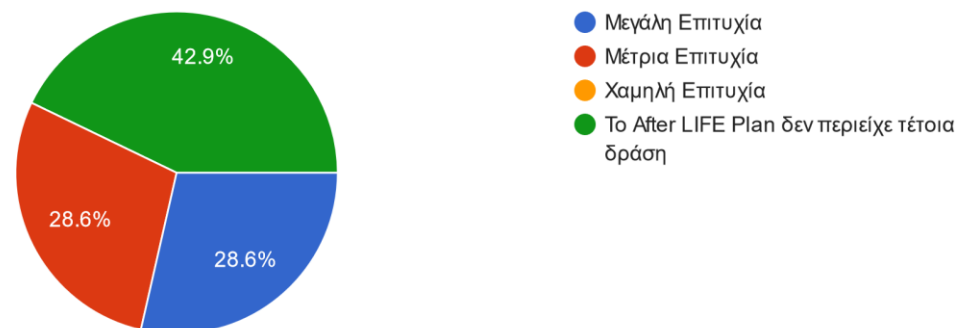

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα


7 responses

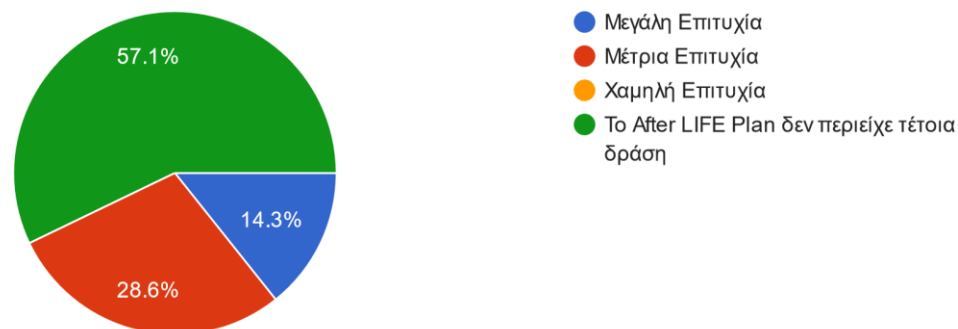

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα


7 responses



ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα


7 responses

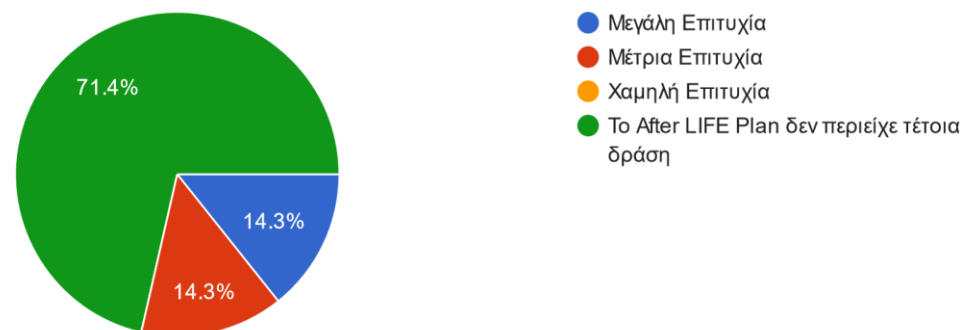

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


7 responses

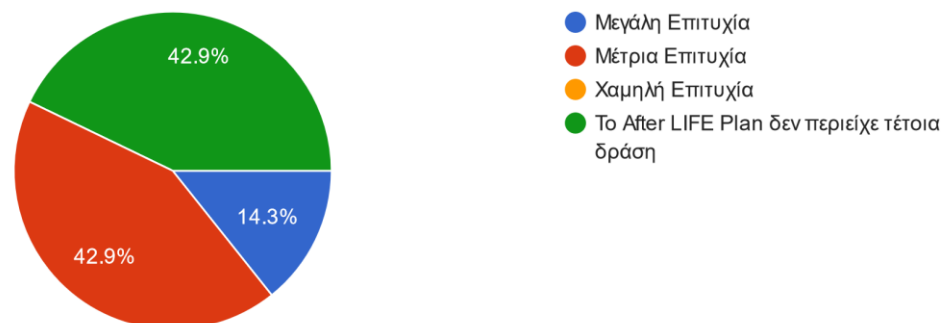

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


7 responses

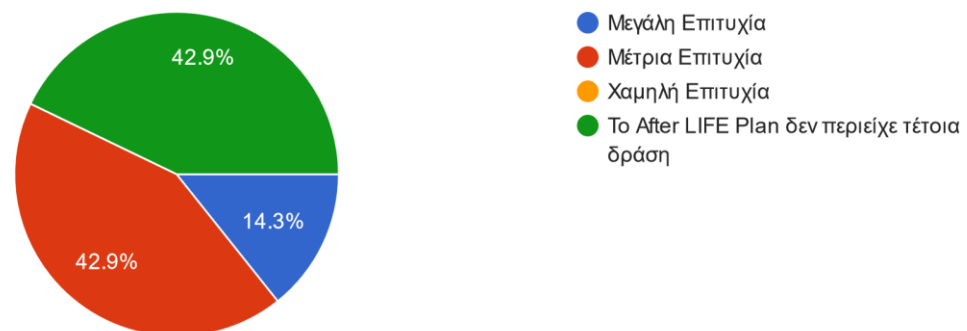

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ


7 responses



ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


7 responses

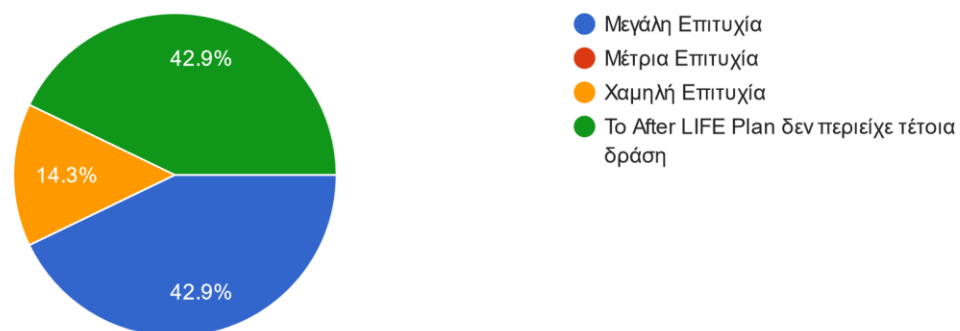

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ


7 responses

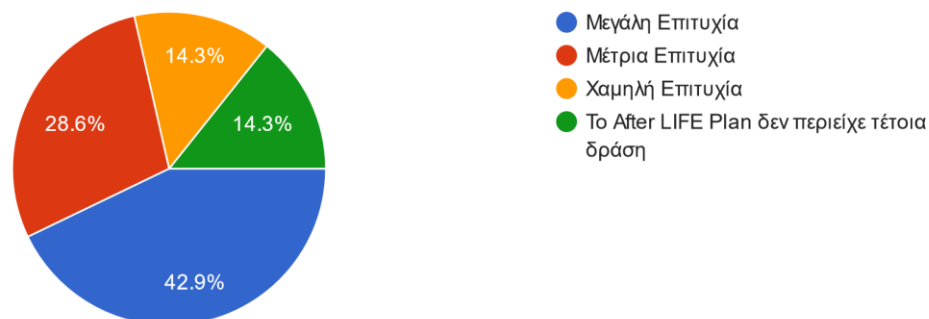

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

7 responses



Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» των Έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», είναι τα εξής:

Πίνακας 24: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	71,40%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ	71,40%
ΕΡΕΥΝΑ	71,40%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	57,10%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	57,10%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	57,10%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	42,90%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	42,90%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	42,90%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	42,90%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	28,60%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	14,30%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι Διαχειριστικές Δράσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά απουσίας από τα «Σχέδια Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» είναι η **Διαχείριση Γης**, η **Διαχείριση Χημικών**, και η **Έρευνα**. Εφόσον ο Τομέας Προτεραιότητας αφορά τα «Σχέδια Μετά LIFE» που διαχειρίζονται απόβλητα, καταγράφεται ως σημαντική έλλειψη η διαχείριση γης όπως και η διαχείριση χημικών, αλλά αντίστοιχα και η ανακύκλωση όλων των ειδών αποβλήτων που απουσιάζει από τα μισά αντίστοιχα «Σχέδια Μετά LIFE». Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι απαιτούνται περισσότερα έργα του Τομέα Προτεραιότητας με στόχευση σε αυτές τις διαχειριστικές δράσεις, όπως και αντίστοιχα στοχευμένα «Σχέδια Μετά LIFE».

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 25: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	42,90%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	42,90%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	42,90%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	42,90%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	28,60%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	28,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	14,30%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	14,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ	14,30%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	14,30%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	14,30%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	14,30%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%

Πίνακας 26: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	85,70%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	42,90%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	42,90%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	28,60%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	28,60%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	28,60%
ΕΡΕΥΝΑ	28,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	14,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	14,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ	14,30%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	14,30%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%

Πίνακας 27: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14,30%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	14,30%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	0,00%
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, παρόλο που όπως φαίνεται στον τελευταίο πίνακα είναι μικρό το ποσοστό των «Σχεδίων Μετά LIFE» που περιείχαν Διαχειριστικές Δράσεις με Χαμηλή Επιτυχία και μάλιστα αυτό αφορά μόνο 2 Διαχειριστικές Δράσεις, την Υποδομές & Εξοπλισμός και Διατήρηση – Συντήρηση – Λειτουργικότητα, θα διερευνηθεί ποιες είναι οι παράμετροι που οδήγησαν σε αυτή τη χαμηλή επιτυχία. Βάσει του συνόλου της βαθμονόμησης της κάθε παραμέτρου υλοποίησης, η αρνητική συνεισφορά της κάθε παραμέτρου υλοποίησης που οδήγησε στην χαμηλή επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων του τελευταίου πίνακα, απεικονίζεται στον κάτωθι Πίνακα 28, ξεκινώντας από τις πιο αρνητικές παραμέτρους και την ποσόστωσή τους στο σύνολο των βαθμονομήσεων, φθίνοντας προς αυτές με την λιγότερο αρνητική επίδραση για την ολοκλήρωση της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία.


Πίνακας 28: Παρουσίαση των πιο αρνητικών (ΠΟΛΥ) Παράμετρων Υλοποίησης των Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το μέγεθος της βαθμονόμησης της αρνητικής συνεισφοράς που οδήγησε στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	Ποσοστό αρνητικής συνεισφοράς στην εφαρμογή Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ	25,00%
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	25,00%
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΕΩΝ	25,00%
ΕΥΡΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	25,00%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ	0,00%
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	0,00%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	0,00%
ΤΟΠΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ	0,00%

Συμπερασματικά, τεκμαίρεται πως οι Παράμετροι Υλοποίησης με την πιο αρνητική συνεισφορά που οδήγησαν στην Χαμηλή Επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων (Πίνακας 27) των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», είναι η **Ανάληψη Ευθύνης Κάθε Συνεργαζόμενου Φορέα**, η **Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων**, η **Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού**, και η **Εύρεση/Μόχλευση Οικονομικών Πόρων**.


Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.

15.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;
7 responses

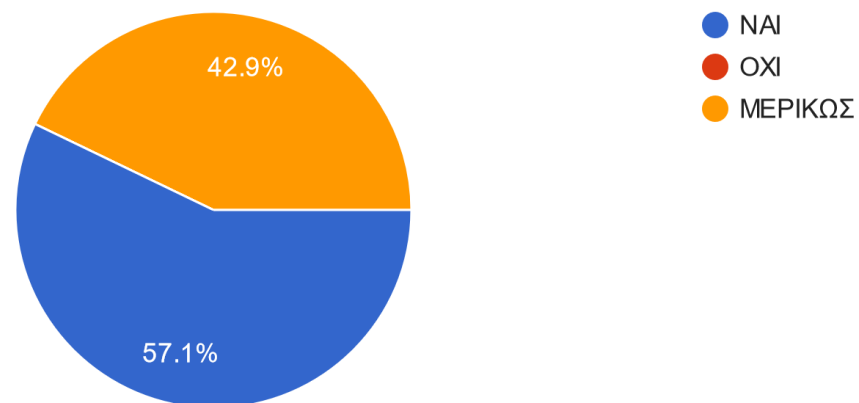

Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι οι **ΜΚΟ**, οι **Παραγωγικοί Φορείς** (π.χ. γεωργοί, αλιείς, μικρομεσαίες), οι **Φορείς Εμπορίου και Πώλησης**, οι **Εκπαιδευτικοί Φορείς** και οι **Κοινωνίες και Ομάδες Πολιτών**.

15.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

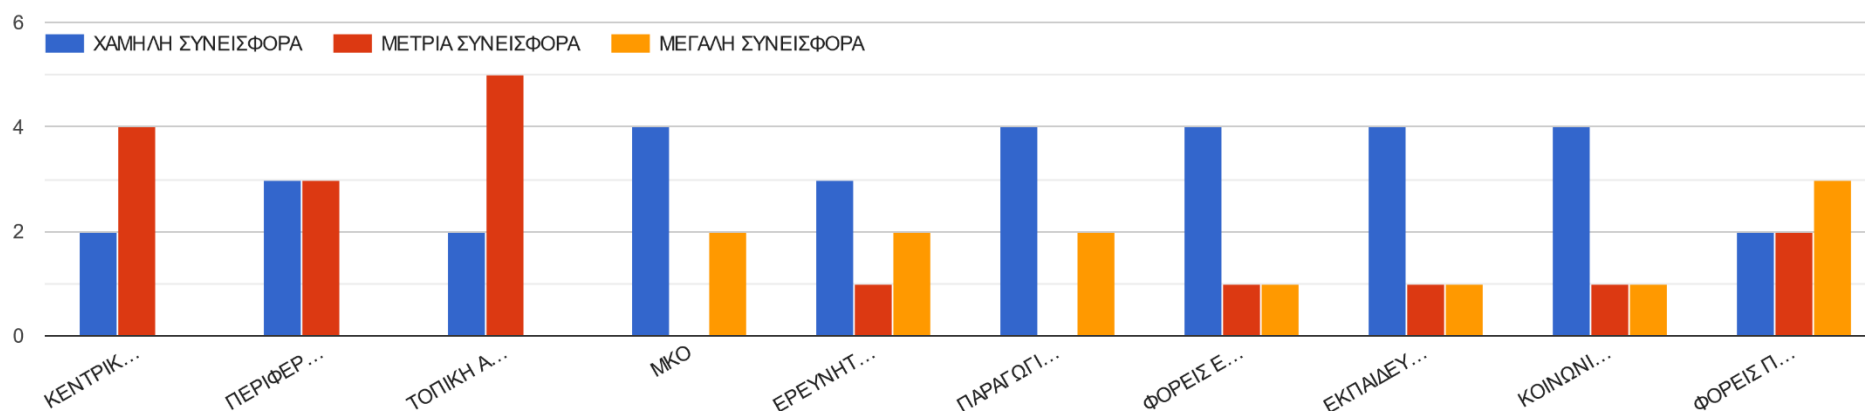


12 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ »

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» για τα οποία συμπληρώθηκαν πλήρως 5 ερωτηματολόγια, κατατάσσονται στις κάτωθι Θεματικές Προτεραιότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1: Σε ποια Θεματική Προτεραιότητα ανήκει το έργο σας (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

5 responses

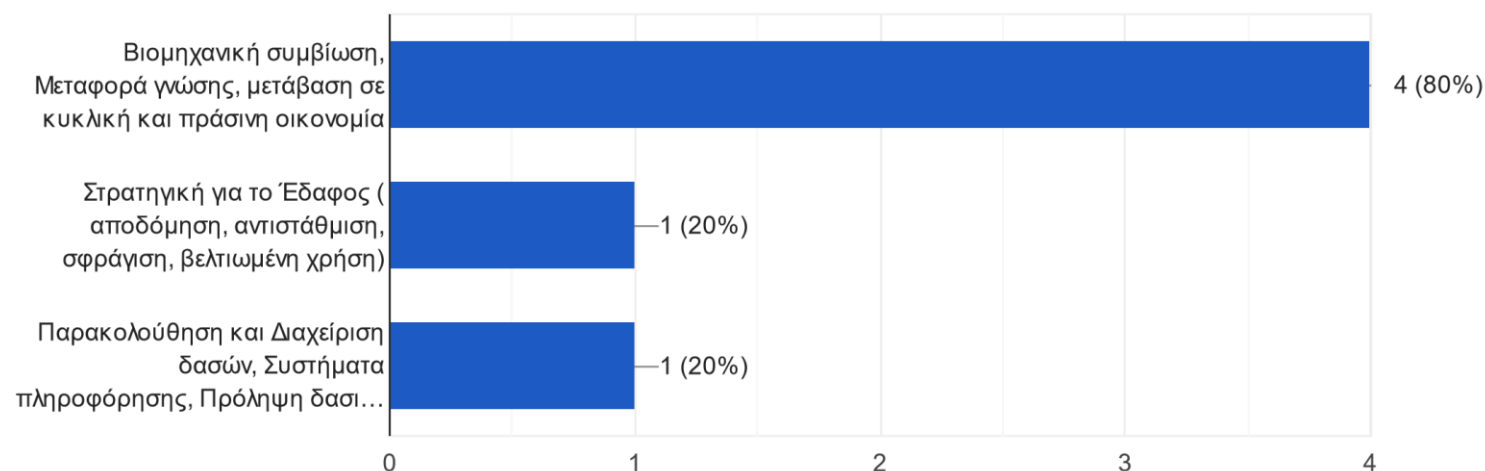

Διαμόρφωση Διαχειριστικών Δράσεων και Παραμέτρων Υλοποίησης δράσεων στο σύνολο των After LIFE Plans του Τομέα Προτεραιότητας

«ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ»

Το σύνολο των Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», είναι οι εξής 15:

- Διαχείριση Γης
- Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος
- Διαχείριση Δασών
- Ανακύκλωση & Διαχείριση – Οργανικά Βιο-Απόβλητα
- Ανακύκλωση & Διαχείριση – Στερεά Απόβλητα
- Ανακύκλωση & Διαχείριση – Εργοστασιακά Βιομηχανικά Βιο-Απόβλητα
- Αγροτική Διαχείριση & Διαχείριση Αλιείας
- Παρακολούθηση, Επιτήρηση, Καταγραφή & Ανατροφοδότηση
- Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων & Στρατηγικών
- Έρευνα
- Υποδομές & Εξοπλισμός
- Συντήρηση & Λειτουργικότητα
- Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Διάχυση
- Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
- Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Αντίστοιχα, η κάθε μία από τις ανωτέρω Διαχειριστικές Δράσεις βαθμονομήθηκε σε κλίμακα 5 μεταβλητών (*καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ*), αξιολογώντας το βαθμό θετικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Μεγάλη και Μέτρια επιτυχία, και αξιολογώντας το βαθμό αρνητικής συνεισφοράς της κάθε Παραμέτρου στην επιτυχία των Δράσεων που καταγράφηκαν με Χαμηλή επιτυχία. Επίσης καταγράφονται και οι Παράμετροι που δεν είχαν καθόλου συνεισφορά, αλλά και οι Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα «Σχέδια Μετά LIFE».

Το σύνολο των Παραμέτρων Υλοποίησης που βαθμονομήθηκαν ήταν οι κάτωθι 10 Παράμετροι:

1). Σχεδιασμός Έργου, 2). Συντονισμός Έργου, 3). Ανάληψη Ευθύνης κάθε συνεργαζόμενου Φορέα, 4). Μορφή Συνεργασίας – Σύμπραξης, 5). Θέματα Λειτουργίας & Αρμοδιοτήτων, 6). Έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων, 7). Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 8). Συμμετοχή Ενδιαφερομένων, 9). Τοπική & Εθνική Οικονομία & Κοινωνικό-Οικονομική Συνοχή, 10). Έρευνα Μόχλευση Οικονομικών Πόρων.


Βαθμός Επιτυχίας Διαχειριστικών Δράσεων

Το σύνολο των 15 Διαχειριστικών Δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», παρουσιάζει τους εξής Βαθμούς Επιτυχίας σχετικά με την εφαρμογή της κάθε δράσης:

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

5 responses

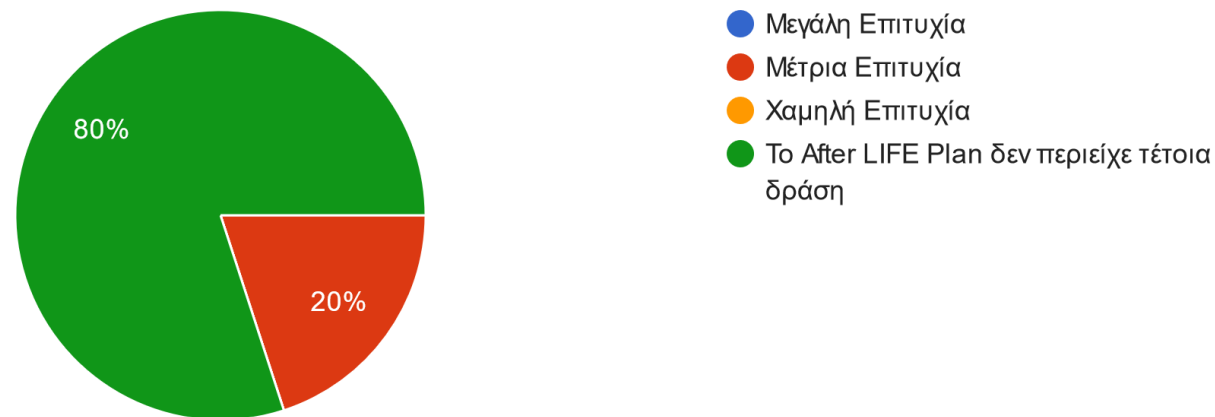


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5 responses

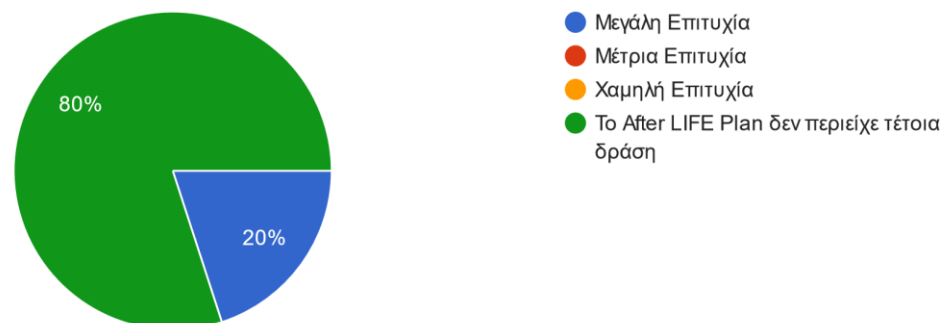


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

5 responses

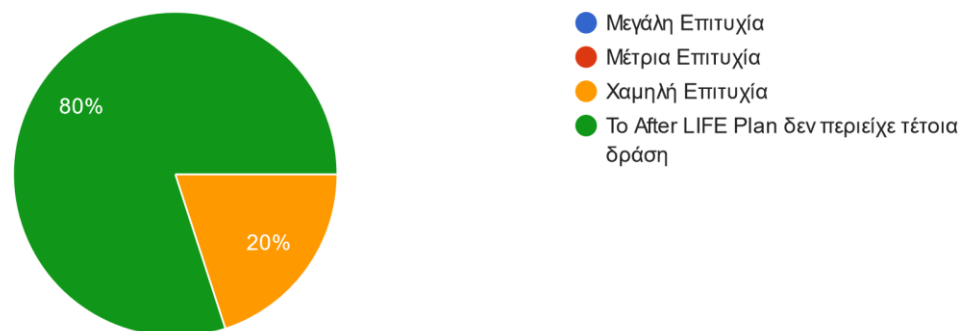


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα

5 responses




ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα

5 responses

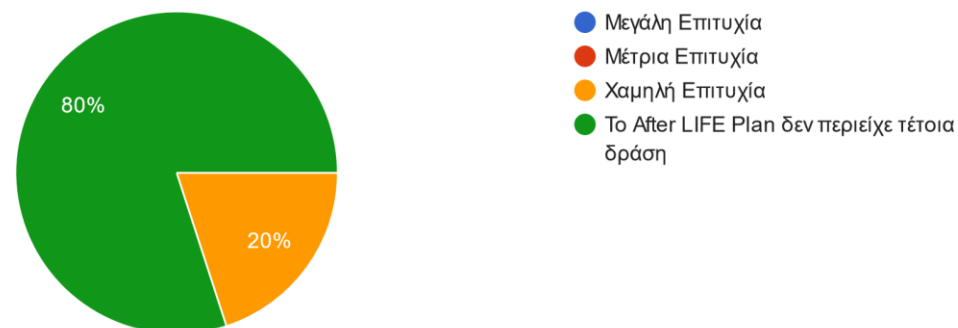


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα

5 responses




ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ


5 responses



ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


5 responses

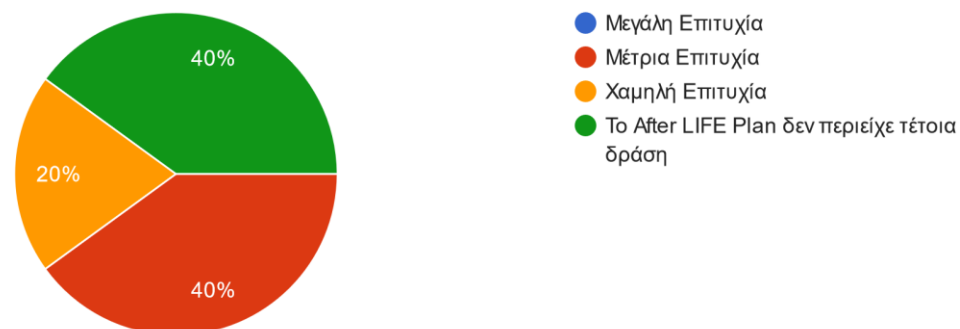

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ


5 responses

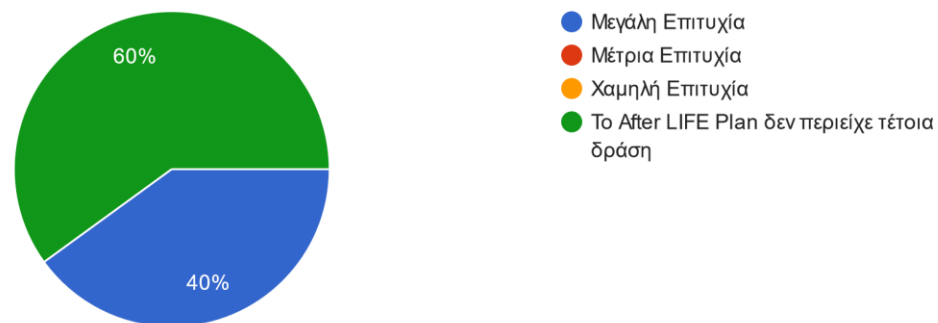

ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan": ΕΡΕΥΝΑ

5 responses




ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5 responses

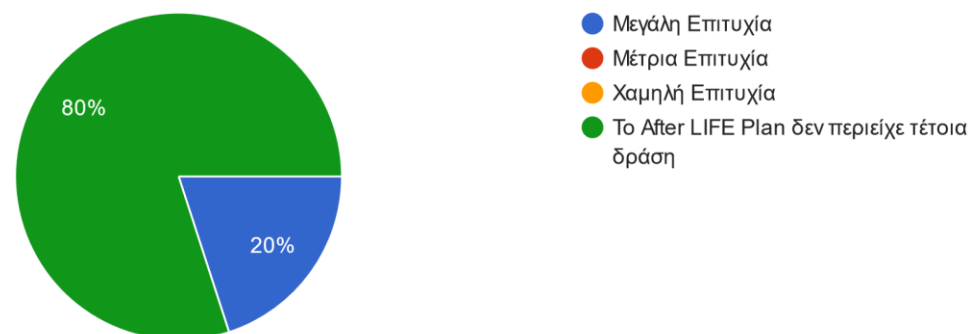


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

5 responses

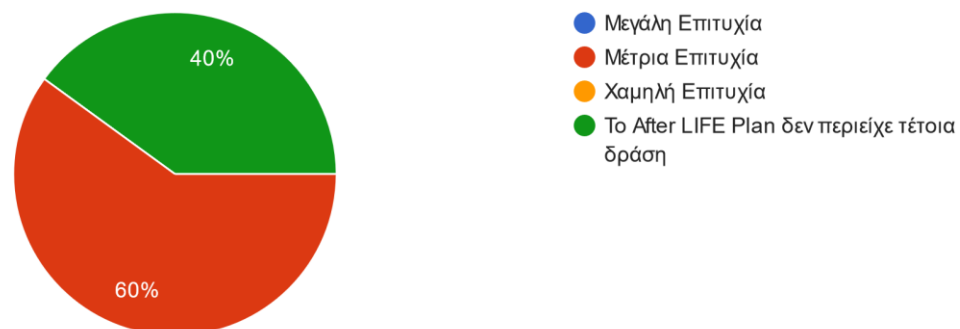


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ

5 responses

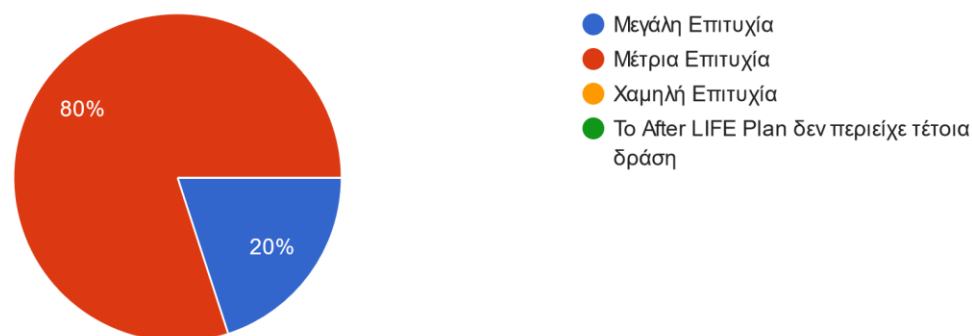


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5 responses

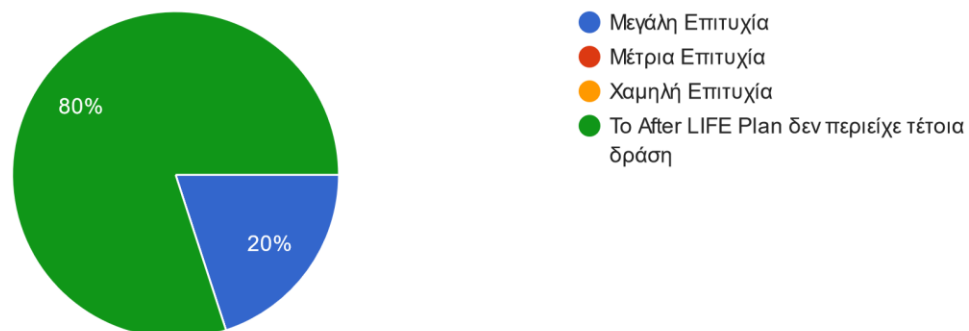


ΕΡΓΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.1: Επιλέξτε το βαθμό επιτυχίας της Δράσης Υλοποίησης του "After LIFE Plan":

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

5 responses



Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι Διαχειριστικές Δράσεις οι οποίες απουσιάζαν με μεγάλα ποσοστά από τα «Σχέδια Μετά LIFE» των Έργων του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», είναι οι εξής:

Πίνακας 29: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία δεν περιείχαν την Διαχειριστική Δράση. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans που δεν περιείχαν αυτή τη δράση</i>
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	100,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	100,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	80,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	80,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	80,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	80,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	80,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	80,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	80,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	60,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	60,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	40,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	40,00%
ΕΡΕΥΝΑ	20%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, 2 Διαχειριστικές Δράσεις απουσιάζουν πλήρως από το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» (**Ανακύκλωση & Διαχείριση Εργοστασιακών Βιομηχανικών Αποβλήτων, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών**), ενώ επιπλέον 8 Δράσεις απουσιάζουν από το 80% των Σχεδίων. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι ειδικά σε ότι αφορά τα «Σχέδια Μετά LIFE» της «Αποδοτικότητας Πόρων», απαιτείται να συμπληρωθεί με πολλές επιπλέον Διαχειριστικές Δράσεις το μωσαϊκό της εφαρμογής μετά τη λήξη των έργων LIFE.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ποσοστό των Διαχειριστικών Δράσεων που αντίστοιχα εμφανίζονται στα «Σχέδια Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ» με Μεγάλη, Μέτρια, και Χαμηλή επιτυχία, αυτά συνοψίζονται στους κάτωθι 3 αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 30: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μεγάλη Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μεγάλη Επιτυχία</i>
ΕΡΕΥΝΑ	60,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	40,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	20,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	20,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00%

Πίνακας 31: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Μέτρια Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Μέτρια Επιτυχία</i>
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	80,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	60,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	40,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	40,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	20,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	20,00%
ΕΡΕΥΝΑ	20,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00%

Πίνακας 32: Παρουσίαση Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το σύνολο των «Σχεδίων Μετά LIFE» τα οποία υλοποίησαν την Διαχειριστική Δράση με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό After LIFE Plans με εφαρμογή της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ	20,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Στερεά Απόβλητα	20,00%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ	20,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανικά Βιο-Απόβλητα	0,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Εργοστασιακά - Βιομηχανικά Απόβλητα	0,00%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0,00%
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	0,00%
ΕΡΕΥΝΑ	0,00%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00%
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	0,00%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00%

Από το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων, παρόλο που όπως φαίνεται στον τελευταίο πίνακα είναι μικρό το ποσοστό των «Σχεδίων Μετά LIFE» που περιείχαν Διαχειριστικές Δράσεις με Χαμηλή Επιτυχία και αυτό αφορά μόνο 3 δράσεις (**Διαχείριση Δασών, Ανακύκλωση & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Παρακολούθηση – Επιτήρηση – Καταγραφή - Ανατροφοδότηση**), είναι σημαντικό να διερευνηθεί ποιες είναι οι παράμετροι που οδήγησαν σε αυτή τη χαμηλή επιτυχία. Βάσει του συνόλου της βαθμονόμησης της κάθε παραμέτρου υλοποίησης, η αρνητική συνεισφορά της κάθε παραμέτρου υλοποίησης που οδήγησε στην χαμηλή επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων του τελευταίου πίνακα, απεικονίζεται στον κάτωθι Πίνακα 5, ξεκινώντας από τις πιο αρνητικές παραμέτρους και την ποσόστωσή τους στο σύνολο των βαθμονομήσεων, φθίνοντας προς αυτές με την λιγότερο αρνητική επίδραση για την ολοκλήρωση της Δράσης με Χαμηλή Επιτυχία.


Πίνακας 33: Παρουσίαση των αρνητικών (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ) Παράμετρων Υλοποίησης των Διαχειριστικών Δράσεων των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», και ποσόστωση αυτών ανάλογα με το μέγεθος της βαθμονόμησης της αρνητικής συνεισφοράς που οδήγησε στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία. Παρουσίαση με φθίνουσα σειρά

	<i>Ποσοστό αρνητικής συνεισφοράς στην εφαρμογή Διαχειριστικών Δράσεων με Χαμηλή Επιτυχία</i>
ΕΥΡΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	100,00%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00%
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ	0,00%
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ	0,00%
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	0,00%
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00%
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΕΩΝ	0,00%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	0,00%
ΤΟΠΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ	0,00%

Συμπερασματικά, τεκμαίρεται η μοναδική Παράμετρος Υλοποίησης με την αποκλειστικά αρνητική συνεισφορά που οδήγησε στην Χαμηλή Επιτυχία των Διαχειριστικών Δράσεων (Πίνακας 32) των «Σχεδίων Μετά LIFE» του Τομέα Προτεραιότητας «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ», είναι η **Εύρεση/Μόχλευση Οικονομικών Πόρων**.


Στην ερώτηση για το αν θεωρούν πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται, η απάντηση συνοψίζεται στο κάτωθι γράφημα.

19.1 Θεωρείτε πως μετά και τη λήξη του After LIFE Plan, οι βασικοί άξονες και στόχοι του έργου LIFE αλλά και του After LIFE Plan, θα συνεχίζουν να υλοποιούνται και επιτυγχάνονται;
5 responses

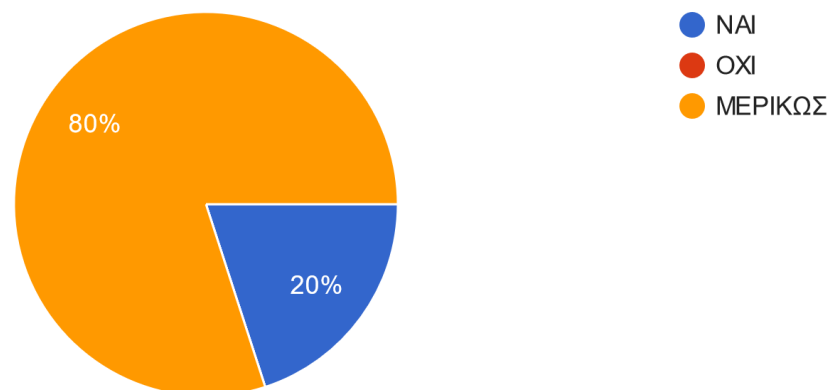

Τέλος, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο υλοποιούν τα «Σχέδια Μετά LIFE» οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς, και βαθμονομήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς τους. Οι φορείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στην υλοποίηση των «Σχεδίων Μετά LIFE», είναι η Περιφερειακή Διοίκηση και η Κεντρική Διοίκηση.

19.2 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την μελλοντική υλοποίηση των βασικών αξόνων και στόχων του LIFE και του After LIFE Plan, και με τι βαθμό επιτυχίας

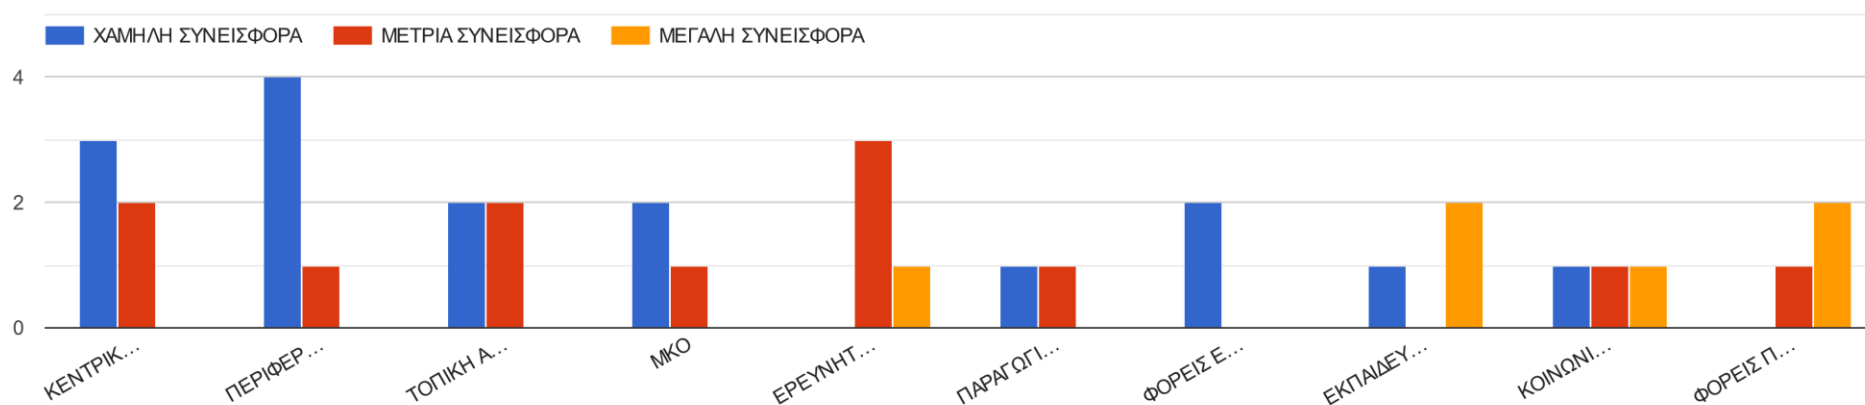

13 Επίλογος

Η ανωτέρω ανάλυση, αποσκοπεί στο να προσφέρει σε όλους τους δυνητικούς μελλοντικούς δικαιούχους και στους τρέχοντες δικαιούχους έργων LIFE, ένα χάρτη κινήσεων και δεδομένων που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, για την επιτυχή υλοποίηση των “After LIFE Plans” – «Σχέδια Μετά LIFE».

Διενεργώντας δομημένα ερωτηματολόγια για όλα τα Υποπρογράμματα, τους Τομείς Προτεραιότητας, τις Διαχειριστικές Δράσεις και τις Παραμέτρους Υλοποίησης των «Σχεδίων Μετά LIFE», των έργων LIFE για τα οποία συλλέχθηκαν After LIFE Plans από το 2000 και έπειτα, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που απεικονίζονται αριθμητικά και γραφιστικά οι τάσεις, οι ανάγκες, και οι ελλείψεις των «Σχεδίων Μετά LIFE» στην ελληνική επικράτεια.

Το παρόν αφορά το 4^ο και το τελευταίο παραδοτέο της Δράσης A.12 στα πλαίσια της οποίας υλοποιήθηκε αυτή η προσέγγιση.
